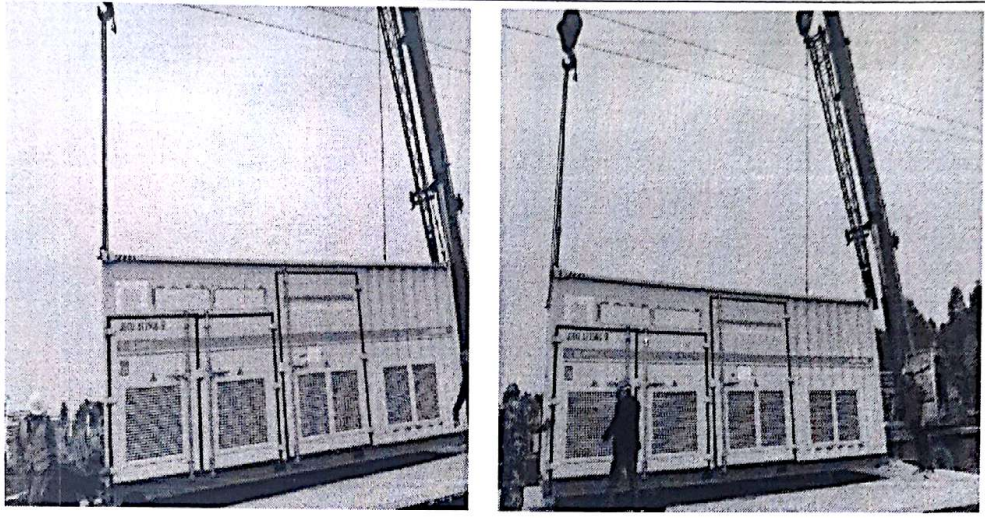


安全旁站监理记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF-AQPZ-030

现场工作内容	对 2#区域进场 1 个箱逆变一体机吊装作业		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	2 名吊装车司机、6 名辅助人员； 施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护。	
	平面布置	1、施工区域现场布置满足吊装安全要求。 2、已打好基础垫层以及箱逆变绑扎浇筑完成，无塌方隐患。	
	安全措施	1、箱逆变吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要求防护措施，防止箱逆变一体机吊装时对箱体造成损坏。 2、现场相关人员佩戴安全帽，远离吊装区域、工作区域拉安全警示带。 3、有安全员统一指挥，在吊装臂下及吊装工作半径内严禁站人。	
现场主要问题	无	监理有关措施 复验意见：未落实	吊装区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离。
	整改结果：无		
旁站时间	开始	2019 年 12 月 03 日 12 时	对应作业
	结束	2019 年 12 月 03 日 18 时	

旁站监理人员（签名）：王洪

作业负责人（签名）：杨振宇
