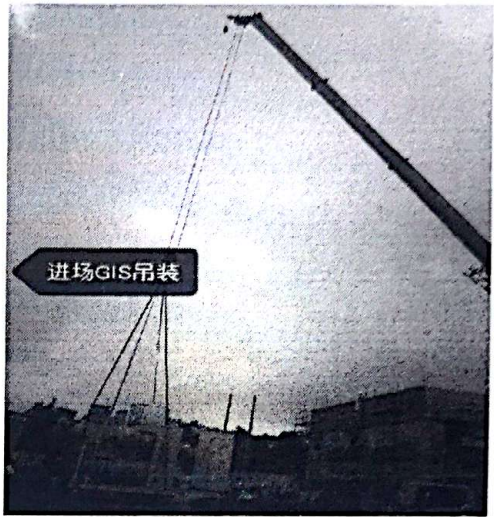


安全旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：LZGF-AQPZ-033

现场工作内容	对升压站进场 GIS 设备进行吊装卸车		
作业地点	 		
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	2 名施工人员及 1 名吊装车司机； 施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护	
	平面布置	1、施工区域现场布置满足施工安全要求。 2、地面较平整，无塌方隐患。	
	安全措施	1、GIS 设备吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要求铁钩紧固在 GIS 接口处，防止 GIS 吊装时脱落高空坠落发生安全事故。 2、现场人员佩戴安全帽，远离吊装区域。	
现场主要问题	无	无	要求现场卸车人员在起吊时远离卸车点，GIS 落地后再进行就位。
	整改结果：无		复验意见：已落实
旁站时间	开始	2019 年 12 月 19 日 9 时	对应作业
	结束	2019 年 12 月 19 日 10 时	

旁站监理人员（签名）：

王渊

作业负责人（签名）：

杨振宇
