

安全旁站监理记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容	开关柜进场卸货吊装			
作业地点	工地现场			
作业项目 主要危险分析	起重伤害----吊装物捆绑不牢固产生设备损坏或人员受伤； 物体打击----材料搬运挤压、磕碰可能会造成材料损坏；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	7名作业人员及1名司机；管理人员2人；指挥人员1人 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。		
	平面 布置	设置安全警戒作业区域，严禁无关人员靠近；		
	安全 措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，吊装机械严禁无证人员操作。		
现场主要问题	现场有人员吸烟。		监理 有关 措施 口头警告，要求现场禁烟。	
	整改结果： 已禁烟		复验意见： 已处理	
旁站 时间	开始	2020年04月18日11时	对应 作业	吊装开始
	结束	2020年04月18日16时		吊装完成

旁站监理人员（签名）：张良玉 任明飞

作业负责人（签名）：张保国



安全旁站 001 现场影像资料:



安全旁站监理记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-AQPZ-002

现场工作内容	避雷器吊装		
作业地点	 工地施工现场		
作业项目 主要危险分析	起重伤害---吊装物捆绑不牢固产生设备损坏或人员受伤; 物体打击---材料调运过程中可能对人员造成伤害;		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	4 名作业人员及 1 名司机; 管理人员 2 人; 指挥人员 1 人 施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。	
	平面布置	设置安全警戒作业区域, 严禁无关人员靠近;	
	安全措施	设置警示带, 工人佩戴安全帽, 吊装机械严禁无证人员操作。	
现场主要问题	现场有人员吸烟。		监理 有关 措施
	整改结果: 已禁烟		
旁站 时间	开始	2020 年 04 月 20 日 14 时	对应 作业
	结束	2020 年 04 月 20 日 16 时	
			口头警告, 要求现场禁烟。 复验意见: 已处理
			吊装开始 吊装完成

旁站监理人员 (签名):

张良玉

任鹏飞

作业负责人 (签名):

张保明

旁站记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-PZJL-SYZ-003

日期及气候：2019 年 12 月 6 日 晴 -3-7℃

施工地点：升压站综合楼

旁站监理的部位或工序：升压站基础回填

旁站监理开始时间：8:30

旁站监理结束时间：19:00

施工情况：

挖机 1 台，蛙式夯机 2 台，施工人员 15 人；土料采用挖掘机运输；对施工人员进行安全技术交底；回填土料内杂物清除；



监理情况：

- 1、层层夯实，每层厚度控制在 30CM，回填 4 层。
- 2、回填土面积 380 平方米。
- 3、检查标高、分层厚度、分层压实系数达到设计要求。

发现问题：无

处理意见：无

备注（包括处理结果）：无。

承包单位：河南兴华电力设计有限公司

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

技 术 员：郭 飞 翔

旁站监理人员：范宇明

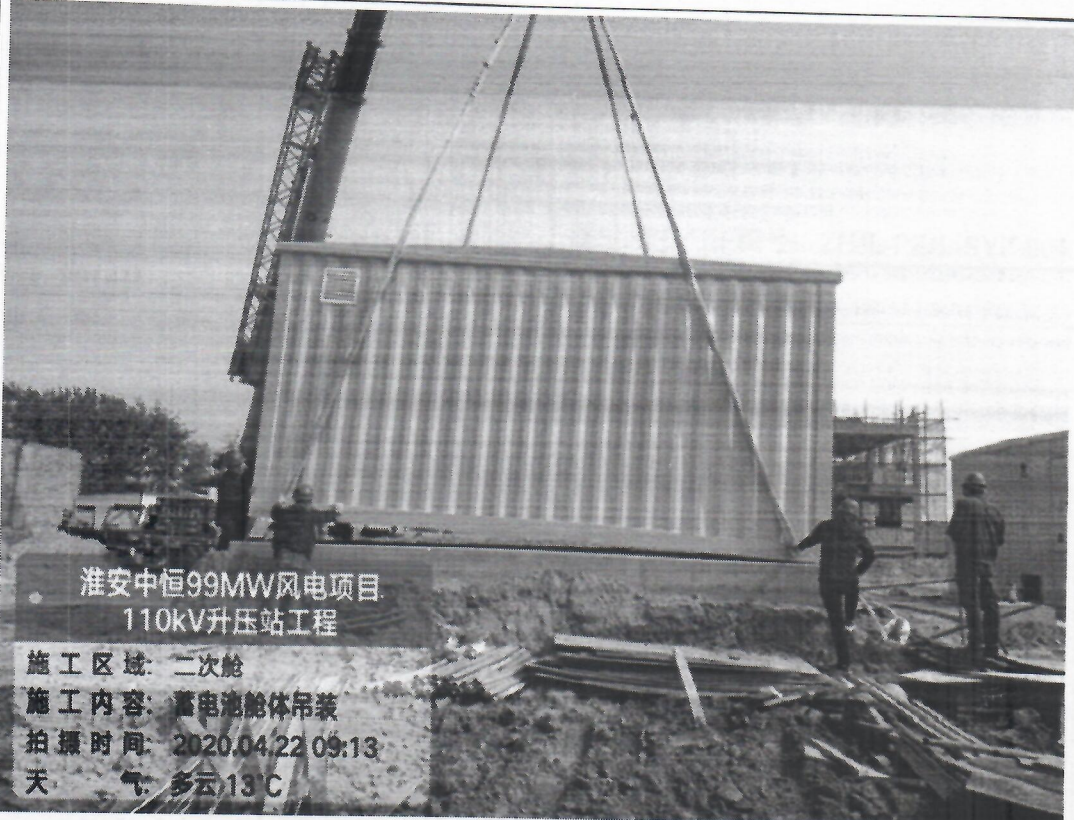
日 期：2019 年 12 月 06 日

日 期：2019 年 12 月 06 日

安全旁站监理记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容	蓄电池舱体吊装			
作业地点	 淮安中恒99MW风电项目 110kV升压站工程 施工区域：二次舱 施工内容：蓄电池舱体吊装 拍摄时间：2020.04.22 09:13 天气：多云 13℃ 工地现场			
作业项目 主要危险分析	起重伤害----吊装物捆绑不牢固产生设备损坏或人员受伤； 物体打击----材料搬运挤压、磕碰可能会造成材料设备损坏；			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	7名作业人员及1名司机；管理人员2人；指挥人员1人 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。		
	平面布置	设置安全警戒作业区域，严禁无关人员靠近；		
	安全措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，吊装机械严禁无证人员操作。		
现场主要问题	无。	监理有关措施	/	
	整改结果： /		复验意见： /	
旁站时间	开始	2020年04月22日09时	对应作业	吊装开始
	结束	2020年04月22日11时		吊装完成

旁站监理人员（签名）：张良玉 王鹏飞

作业负责人（签名）：张保明

安全旁站监理记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-AQPZ-005

现场工作内容	一次舱 5#柜吊装		
作业地点	 淮安中恒99MW风电项目 110kV升压站工程 施工区域：一次舱 施工内容：5#柜吊装并柜 拍摄时间：2020.04.24 16:53 天气：晴 22°C 工地现场		
作业项目 主要风险分析	起重伤害----吊装物捆绑不牢固产生设备损坏或人员受伤； 物体打击----材料搬运挤压、磕碰可能会造成材料设备损坏；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	7名作业人员及1名司机；管理人员2人；指挥人员1人 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。	
	平面 布置	设置安全警戒作业区域，严禁无关人员靠近；	
	安全 措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，吊装机械严禁无证人员操作。	
现场主要问题	现场有个别个人未戴安全帽。 整改结果： 已佩戴。	监理 有关 措施	口头警告。 复验意见： 已佩戴，符合要求。
旁站 时间	开始 2020年04月23日09时 结束 2020年04月23日11时	对应 作业	吊装开始 吊装完成

旁站监理人员（签名）：张良

作业负责人（签名）：张保明

旁站记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-PZJL-SYZ-005

日期及气候：2019 年 12 月 14 日 多云
3-11℃

施工地点：升压站主变

旁站监理的部位或工序：升压站主变架构浇筑

旁站监理开始时间：12:30

旁站监理结束时间：18:00

施工情况：

商品砼 C30。施工人员 10 人，泵车一辆，振动棒一台，管理人员 4 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好；



监理情况：

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2 测量钢筋尺寸，符合设计图纸要求。
- 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作。

发现问题：无

处理意见：无

备注（包括处理结果）：无。

承包单位：河南兴华电力设计有限公司

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

技 术 员：郭飞翔

旁站监理人员：范全明

日 期：2019 年 12 月 14 日

日 期：2019 年 12 月 14 日

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-SYZ-006

日期及气候: 2019 年 12 月 16 日 阴 7-15℃

施工地点: 升压站主变

旁站监理的部位或工序: 升压站主变构架回填

旁站监理开始时间: 10:30

旁站监理结束时间: 12:00

施工情况:

挖机 1 台, 蛙式夯机 1 台, 施工人员 3 人; 土料采用挖掘机运输; 对施工人员进行安全技术交底; 回填土料内杂物清除;



监理情况:

- 1、层层夯实, 每层厚度控制在 30CM, 回填 4 层。
- 2、回填土面积 380 平方米。
- 3、检查标高、分层厚度、分层压实系数达到设计要求。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 无。

承包单位: 河南兴华电力设计有限公司

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

技术员: 郭飞翔

旁站监理人员: 范金明

日期: 2019 年 12 月 16 日

日期: 2019 年 12 月 16 日

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-SYZ-007

日期及气候: 2019 年 12 月 19 日 阴转晴		施工地点: 升压站综合楼一层	
旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼一层浇筑			
旁站监理开始时间: 8:30		旁站监理结束时间: 16:00	
施工情况: 商品砼 C30。施工人员 28 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 7 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;  升压站综合楼一层浇筑振捣  升压站综合楼底板及框架柱浇筑			
监理情况: 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2 测量钢筋尺寸,符合设计图纸要求。 3、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。 4、要求浇筑时及时振捣到位,要求浇筑完毕后收面及覆盖养护。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无。			
承包单位: 河南兴华电力设计有限公司		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司	
技 术 员: 郭飞翔		旁站监理人员: 范利	
日 期: 2019 年 12 月 19 日		日 期: 2019 年 12 月 19 日	

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-SYZ-008

日期及气候: 2019 年 12 月 21 日 阴 5-8℃		施工地点: 升压站 GIS 基础	
旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼一层浇筑			
旁站监理开始时间: 8:30		旁站监理结束时间: 14:00	
施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;  升压站GIS基础构架振捣  升压站GIS基础构架浇筑			
监理情况: 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2 测量钢筋尺寸,符合设计图纸要求。 3、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。 4、要求浇筑时及时振捣到位,要求浇筑完毕后收面及覆盖养护。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无。			
承包单位: 河南兴华电力设计有限公司		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
技 术 员: 郭飞翔		旁站监理人员: 范明	
日 期: 2019 年 12 月 21 日		日 期: 2019 年 12 月 21 日	

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-SYZ-009

日期及气候: 2019 年 12 月 24 日 多云 4-9℃		施工地点: 升压站 GIS 基础、主变基础	
旁站监理的部位或工序: 升压站主变、GIS			
旁站监理开始时间: 13:30		旁站监理结束时间: 15:00	
施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;  淮安中恒99MW风电项目 110KV升压站工程 施工区域: 升压站 施工内容: 主变、GIS基础底板浇筑 拍摄时间: 2019.12.24 13:03 天气: 多云 9℃ 			
监理情况: 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2 测量钢筋尺寸, 符合设计图纸要求。 3、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。 4、要求浇筑时及时振捣到位, 要求浇筑完毕后收面。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无。			
承包单位: 河南兴华电力设计有限公司		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
技 术 员: 郭飞翔		旁站监理人员: 苗利	
日 期: 2019 年 12 月 24 日		日 期: 2019 年 12 月 24 日	

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-SYZ-010

日期及气候: 2019 年 12 月 31 日 多云 -2-6℃

施工地点: 升压站综合楼二层

旁站监理的部位或工序: 综合楼二层顶板浇筑

旁站监理开始时间: 9:30

旁站监理结束时间: 14:00

施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2 测量钢筋尺寸, 符合设计图纸要求。
- 3、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。
- 4、要求浇筑时及时振捣到位, 要求浇筑完毕后收面。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 无。

承包单位: 河南兴华电力设计有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

技 术 员:

郭飞翔

旁站监理人员:

范金明

日 期: 2019 年 12 月 31 日

日 期: 2019 年 12 月 31 日

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-SYZ-011

日期及气候: 2019 年 12 月 31 日 多云-2-6℃

施工地点: 升压站 SVG

旁站监理的部位或工序: SVG 基础浇筑

旁站监理开始时间: 12:30

旁站监理结束时间: 14:00

施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。
- 3、要求浇筑时及时振捣到位,要求浇筑完毕后收面。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注(包括处理结果): 无。

承包单位: 河南兴华电力设计有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

技术员: 郭飞翔

旁站监理人员: 曹利

日期: 2019 年 12 月 31 日

日期: 2019 年 12 月 31 日

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-SYZ-012

日期及气候: 2020 年 1 月 3 日 多云 1-10℃

施工地点: 升压站二次舱基础

旁站监理的部位或工序: 二次舱基础浇筑

旁站监理开始时间: 15:30

旁站监理结束时间: 18:00

施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。
- 3、要求浇筑时及时振捣到位,要求浇筑完毕后收面。
- 4、2 测量绑筋规格,符合图纸要求

发现问题: 无

处理意见: 无

备注(包括处理结果): 无。

承包单位: 河南兴华电力设计有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

技术 员: 郭飞翔

旁站监理人员: 崔利

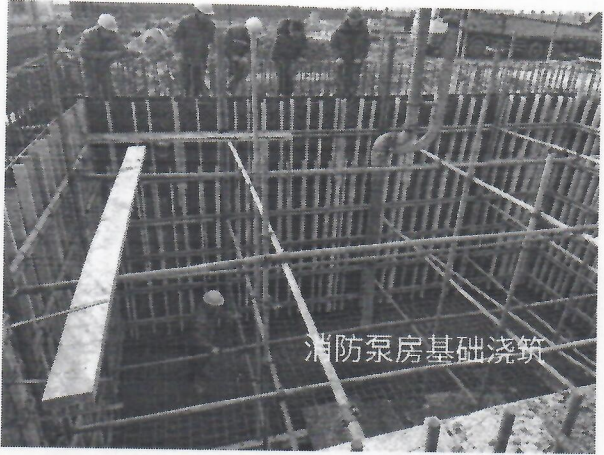
日 期: 2020 年 1 月 3 日

日 期: 2020 年 1 月 3 日

旁站记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-PZJL-SYZ-013

日期及气候：2020 年 1 月 12 日 霾 -2-5℃	施工地点：升压站消防泵房
旁站监理的部位或工序：消防泵房浇筑	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：18:00
施工情况：：商品砼 C30。施工人员 10 人，泵车一辆，振动棒 2 台，管理人员 3 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好；  	
监理情况： 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作。 3、要求浇筑时及时振捣到位，要求浇筑完毕后收面。 4、测量绑筋规格，符合图纸要求	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无。	
承包单位：河南兴华电力设计有限公司	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
技 术 员：郭 飞 翔	旁站监理人员：苗宇明
日 期：2020 年 1 月 12 日	日 期：2020 年 1 月 12 日

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-SYZ-014

日期及气候: 2020 年 1 月 12 日 霾 -2-5℃	施工地点: 升压站主变基础
旁站监理的部位或工序: 主变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 14:30
施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;  	
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。 3、要求浇筑时及时振捣到位, 要求浇筑完毕后收面。 4、测量绑筋规格, 符合图纸要求	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无。	
承包单位: 河南兴华电力设计有限公司 技 术 员: 郭飞翔	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 苗宇明
日 期: 2020 年 1 月 12 日	日 期: 2020 年 1 月 12 日
