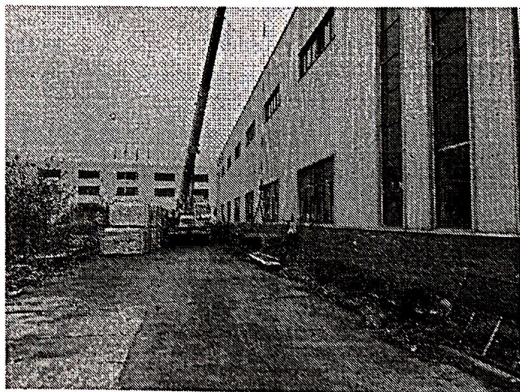


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号: JSNY-ZHJL-PZJL-006

日期及天气: 2020.4.1 多云	施工单位: 山东登莱电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 吊装组件至厂房顶	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、对现场操作人员进行安全、施工技术交底 2、施工前检查现场安全防护工作到位情况,警戒线已拉,施工人员安全帽已戴。 3、现场施工人员 13 人,管理人员 1 人,用到 20 吨吊车 1 辆,手动叉车 1 辆 4、对现场吊车和叉车作业人员的操作证审查 5、要求现场严格把控每一个工序细节,认真负责,按操作规程严格执行操作作业,做到无事故吊装作业。	
	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 
