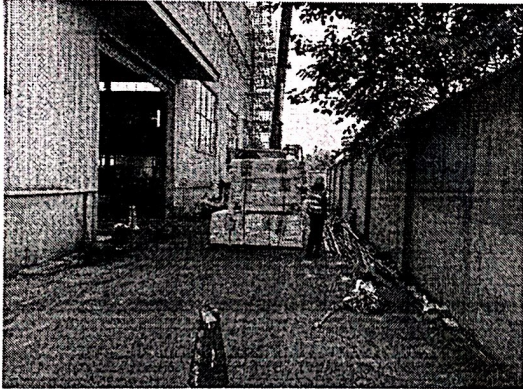


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

编号: CZLT-ZHJL-PZJL-001

日期及天气: 2020.08.23 多云	施工单位: 山东登莱电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 吊装水槽、导轨材料至厂房顶	
旁站监理开始时间: 07:00	旁站监理结束时间: 10:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、对现场操作人员进行安全、施工技术交底 2、施工前检查现场安全防护工作到位情况 3、现场施工人员 9 人, 管理人员 1 人, 用到 20 吨吊车 1 辆, 叉车 1 辆 4、对现场吊车和叉车作业人员的操作证审查 5、要求现场严格把控每一个工序细节, 认真负责, 按操作规程严格执行操作作业, 做到无事故吊装作业。	
 	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 
