

5 安全旁站监理记录表

工程名称：山东星球企业孵化也有有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

编号 JXM9-JL-AQ017


现场工作内容		横梁导轨吊装			
作业地点		施工现场			
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全验证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。			
	平面布置	1、横梁吊运及吊车周围用警示带进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、横梁吊装区域与其它区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。			
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理单位进行审批，方案满足施工要求。 2、横梁吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因横梁的碰撞致使吊带绳卡断。 3、吊装过程中横梁一端要用溜绳控制方向，待横梁就位稳定后，安全员退场，方可作业人员方可开始进入作业点。			
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监理整改措施	监理指令： 无	
	整改结果：			复查意见：	
旁站时间	开始	2020 年 11 月 23 日 14 时 20 分		时 应 作 业	开始前人、机、环境好。
	结束	2020 年 11 月 23 日 16 时 30 分			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：张献忠

作业负责人（签名）：闫海



扫描全能王 创建

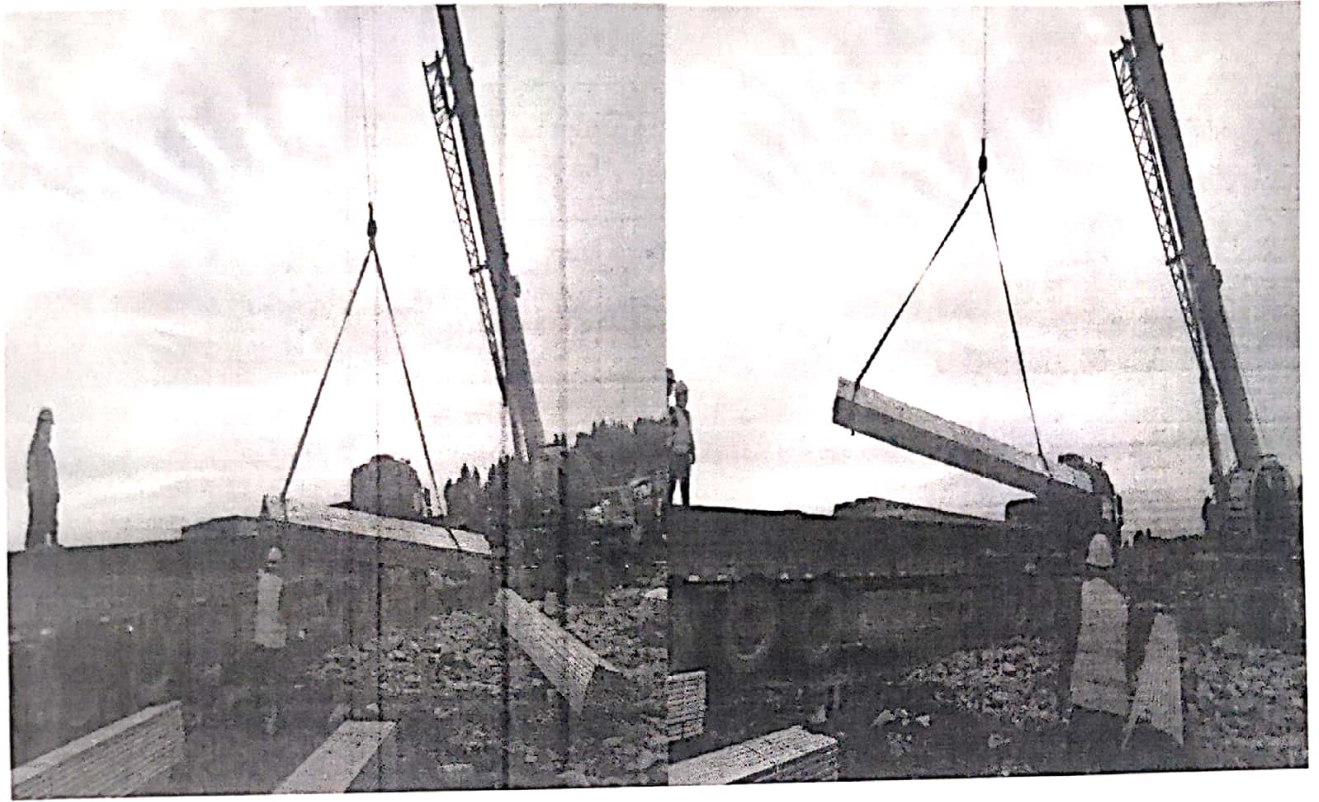

扫描全能王 创建
