


旁站监理记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目
 编号: JXM9-JL01-PZ034

日期及天气: 2020 年 11 月 29 日 晴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 54 号箱变基础梁板柱浇筑	
旁站监理开始时间: 8:20	旁站监理结束时间: 12:30
施工情况: 现场采用自拌混凝土, 现场施工人数 7 人, 管理人员 1 人, 三轮车 2 台, 现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。	
监理情况: 模板安装、钢筋绑扎验收合格, 混凝土塌落度符合要求, 浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆、爆模情况发生, 表面平整度满足要求, 已做混凝土试块。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 许青松 日期: 2020 年 11 月 29 日	



旁站监理记录表 JXM9-JL01-PZ034(附图)

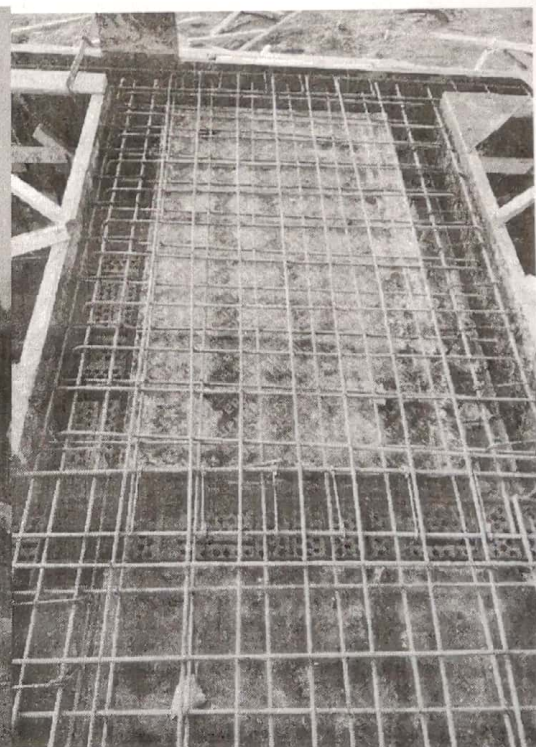

扫描全能王 创建
