

安全旁站监理记录表

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL—007

现场工作内容		管桩吊装	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已安全检查并出工作票鉴证。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护，安全员负责现场安全事宜。 3、施工前已进行全员安全交底并全员进行了签字。	
	平面布置	1、吊车区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域。 2、吊车就位于鱼塘光伏区旁侧，支撑平稳。 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、管桩吊装时所用的钢丝绳，在吊点处要求做好防护措施，防止管桩吊装时对接处将吊绳卡断。 3、现场人员远离吊装区域。	
现场主要问题	无	监理有关措施	无
	整改结果：		复验意见：
旁站时间	开始	2020 年 12 月 1 日 8: 00	对应作业
	结束	2020 年 12 月 1 日 11: 30	已具备吊装条件 已安全吊装完毕

旁站监理人员（签名）：孙成龙


作业负责人（签名）：贾海林

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求



扫描全能王 创建

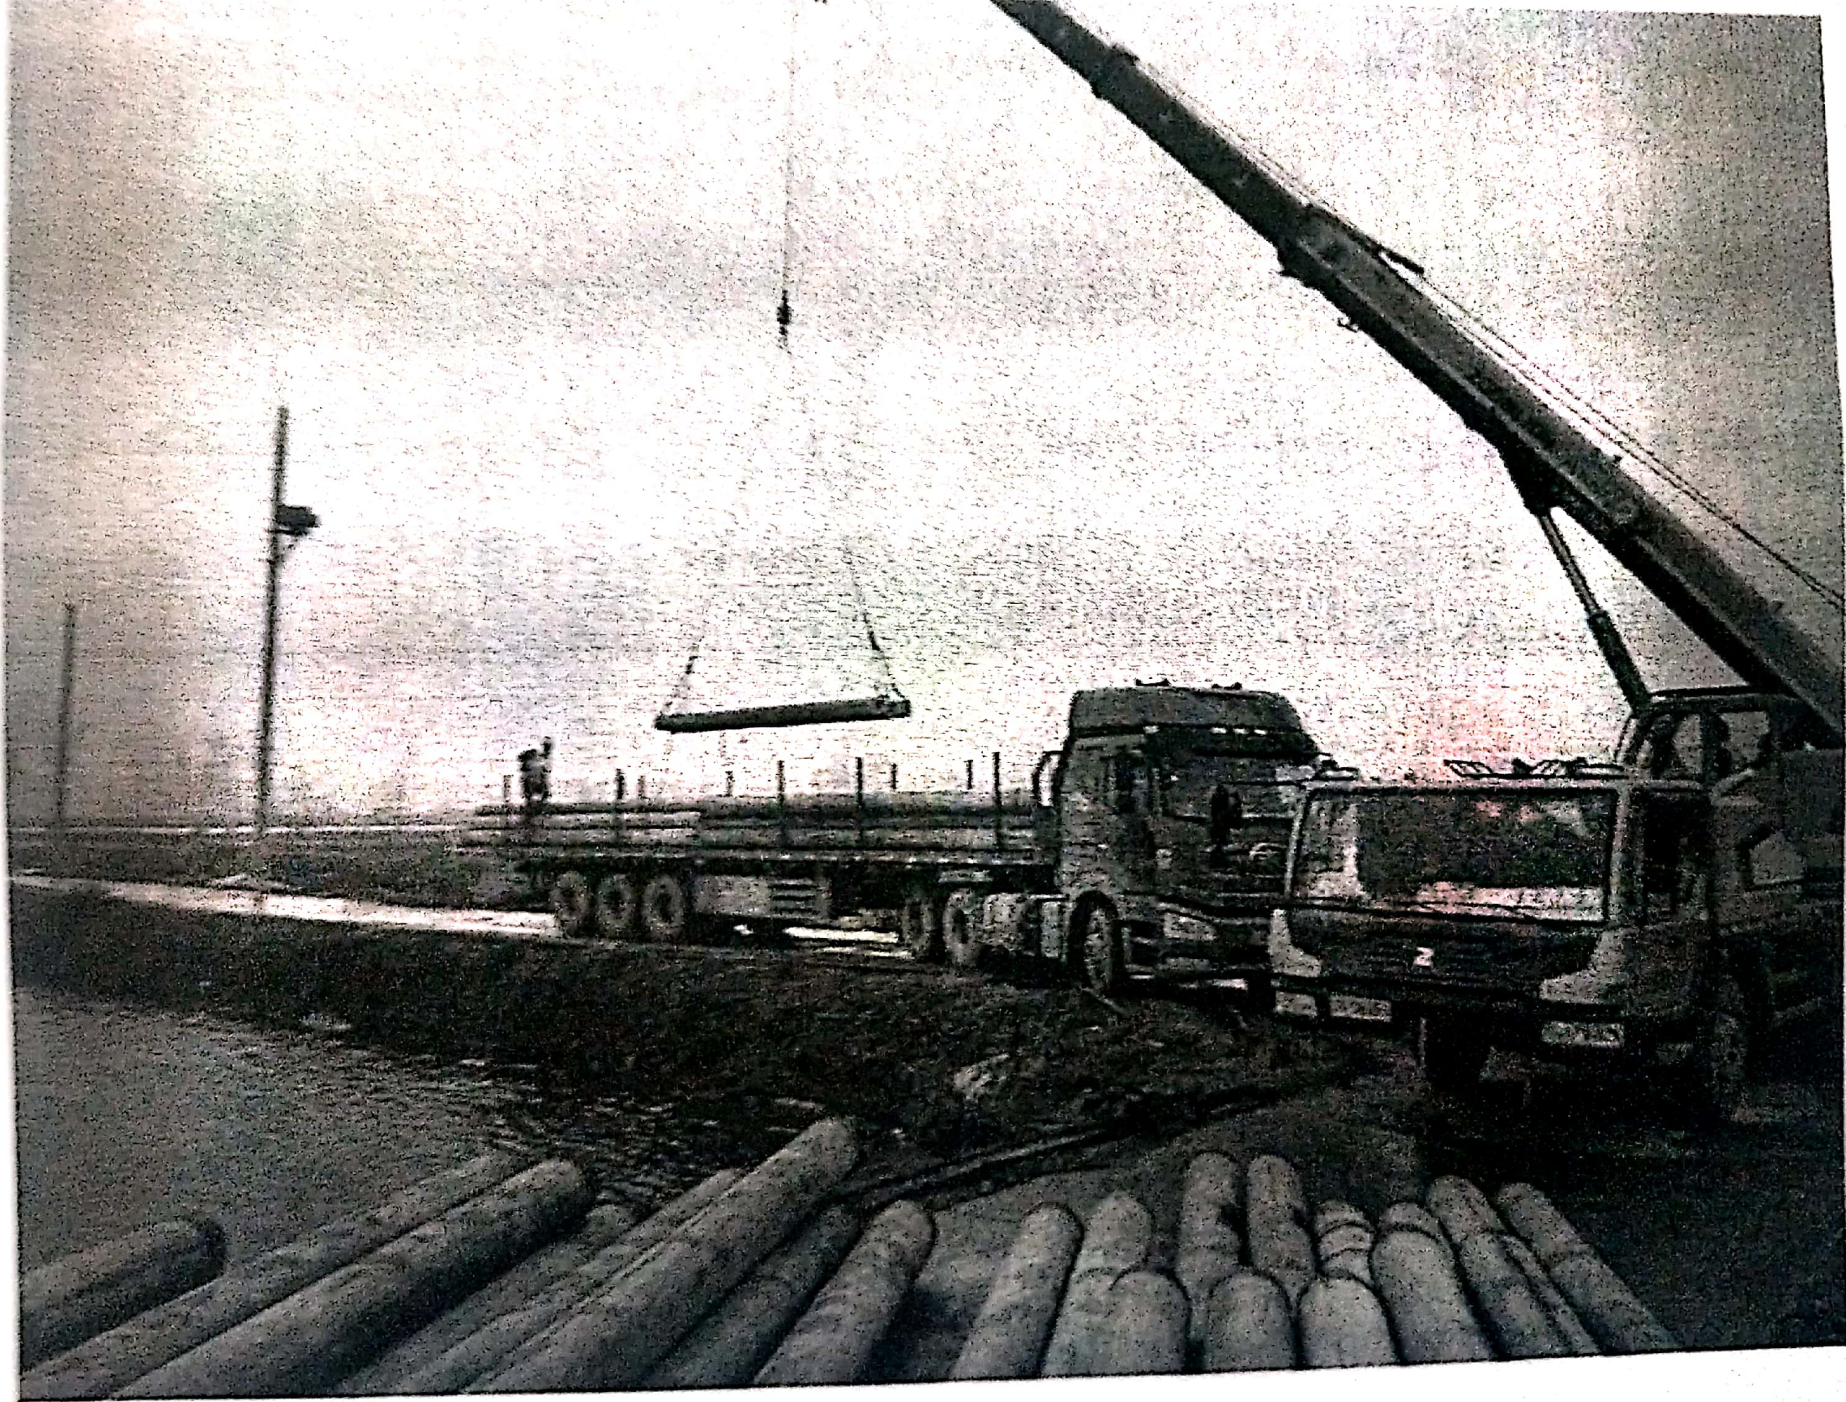

扫描全能王 创建
