

安全旁站监理记录表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM22-TJXM-01

现场工作内容		光伏支架立柱、逆变器、桥架以及辅材吊装		
作业地点		厂区 1#、2#、3#屋面		
作业项目主要危险分析		起动机钢丝绳、吊钩、坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳等。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场屋面及地面共配置施工人员 12 人，吊装到屋面后散料，满足现场施工需要。 2、吊装方案已制订，并以进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。		
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地路面平整，满足作业要求，临时设施符合安全文明标准化管理规定要求		
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、起重机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置安全警警示带、警示标识牌，严禁无关人员进入吊装现场。		
现场主要问题	施工现场安全警戒带防护不到位		监理有关措施	要求所有作业人员必须佩戴安全帽，过往车辆禁止通行。
	整改结果： 已按安全要求布置、防护完成			复验意见： 同意开始作业
旁站时间	开始	2021 年 10 月 07 日 09.00 时 20.00 分	对应作业	已准备就绪，开始吊装




扫描全能王 创建

	结束 2021 年 10 月 07 日 13.00 时 10.00 分	吊装结束
--	---	------

旁站监理人员（签名）： *何明有*

作业负责人（签名）： *何敬北*

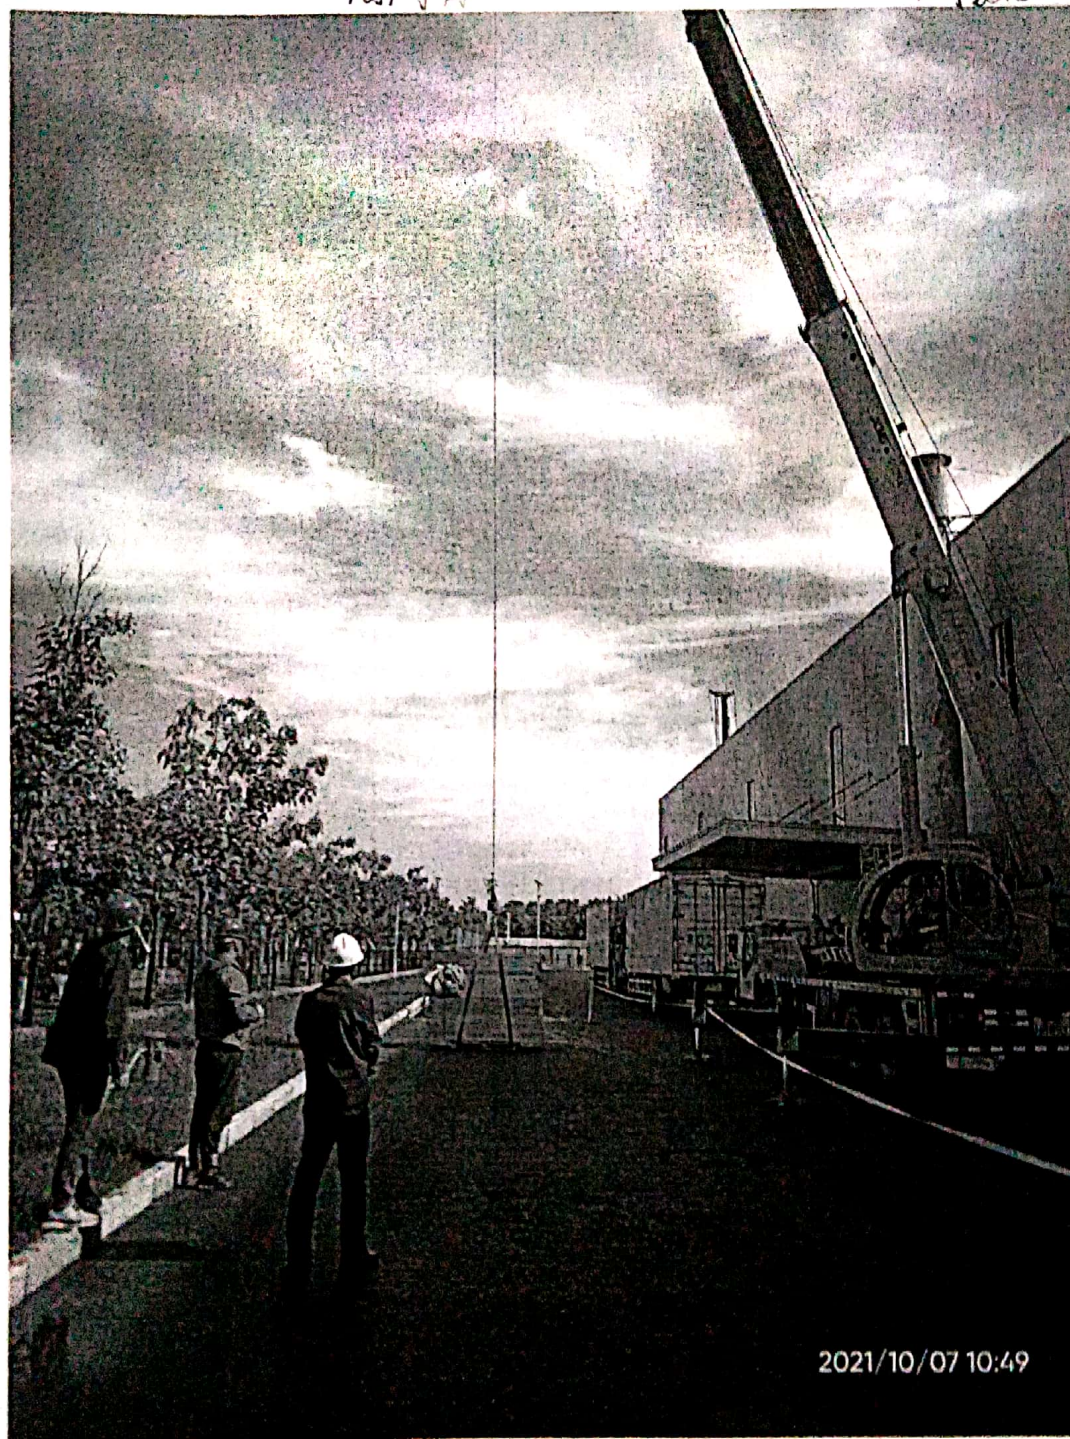

扫描全能王 创建
