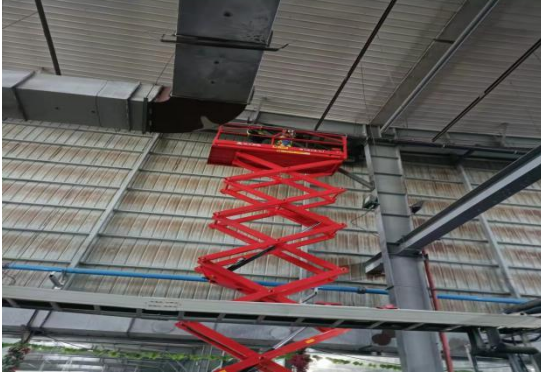

浙江天能动力能源有限公司吴山光储
5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目（一期）

监 理 周 报

第 四 期

（2021 年 11 月 6 日-2021 年 11 月 12 日）

工程名称	浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目（一期）	建设单位	长兴智旺新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	海宁科茂微电网技术有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 加固工程，本周完成 6%，已完成总量的 96%。组装夹具，本周完成 50%，完成总量的 70%。夹具安装已完成 50%，完成总量的 50%。导轨安装已完成 30%，完成总量的 30%。		
下周计划	组装夹具完成 20%。安装夹具 30%，导轨安装 30%，运维通道完成 50%，组件安装 50%。		
安全文明施工情况	正常		
施工质量	无		
设备材料进场情况	夹具进场 80% 导轨进场 90% 玻璃格栅 100%		
人员机械情况	施工人员;40 人，举臂车 1 辆，升降车 1 辆，吊车 1 辆。		

	
吊装旁站	吊装材料
	
组装夹具	安装导轨
	
加固撑管	检测材料
	
检测导轨	

