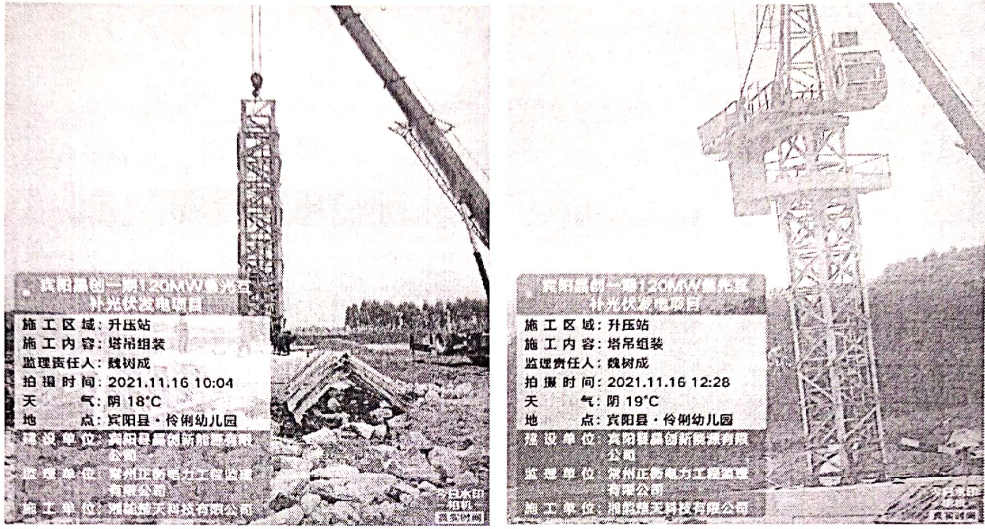


安全旁站监理记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		现场塔吊进场安装	
作业地点			
作业项目主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、作业人员的安全帽、安全带佩戴齐全情况及防坠落防护措施是否到位。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊运过程中地面 1 名指挥人员及 1 名安全员，塔吊安装人员共 4 名。吊车司机和指挥人员各配一台对讲机实时沟通。已对人员已进行安全技术交底。	
	平面布置	塔吊作业范围设立 1 台吊车进行配合安装，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全措施	相关人员佩戴安全帽，现场指挥人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。作业区域禁止有人员活动。	
现场主要问题	因塔吊安装作业风险性较大，需设安全员进行现场监督。		监理单位 复验意见： 能按照施工方案及监理指令执行操作
	整改结果： 已设专职安全员进行现场监督。		
旁站时间	开始	2021 年 10 月 28 日 13 时 30 分	对应作业
	结束	2021 年 10 月 28 日 18 时 00 分	
		现场准备工作就位 现场整理工作完善	

旁站监理人员（签名）：魏树成

作业负责人（签名）：杨江平
