

## 安全旁站监理记录表

工程名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM22-03

|              |                                    |                                                                                                                                                                 |                                                    |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 现场工作内容       | 光伏组件吊装                             |                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 作业地点         | 厂区聚丙烯仓库屋面                          |                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 作业项目主要危险分析   | 起动机钢丝绳、吊钩、坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳等。 |                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理                               | 1、现场屋面及地面共配置施工人员 8 人，吊装到屋面后散料，满足现场施工需要。<br>2、吊装方案已制订，并以进行安全技术交底。<br>3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。                                                                         |                                                    |
|              | 平面布置                               | 1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2、场地路面平整，满足作业要求，临时设施符合安全文明标准化管理规定要求                                                                                                    |                                                    |
|              | 安全措施                               | 1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。<br>2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。<br>3、起重机使用中回转半径内严禁站人。<br>4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。<br>5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。<br>6、现场设置安全警示带、警示标识牌，严禁无关人员进入吊装现场。 |                                                    |
| 现场主要问题       | 施工现场安全警戒带到位                        |                                                                                                                                                                 | 要求所有作业人员必须佩戴安全帽，过往车辆禁止通行，信号司索工、起重机指挥员、专职安全员、监护人到位。 |
|              | 整改结果：                              |                                                                                                                                                                 | 复验意见：<br><br>同意开始作业                                |






|          |    |                                     |          |            |
|----------|----|-------------------------------------|----------|------------|
| 旁站<br>时间 | 开始 | 2022 年 07 月 13 日 9.00 时<br>30.00 分  | 对应<br>作业 | 已准备就绪，开始吊装 |
|          | 结束 | 2022 年 07 月 13 日 19.00 时<br>00.00 分 |          | 吊装结束       |

旁站监理人员（签名）：周同有

作业负责人（签名）：孙明顺

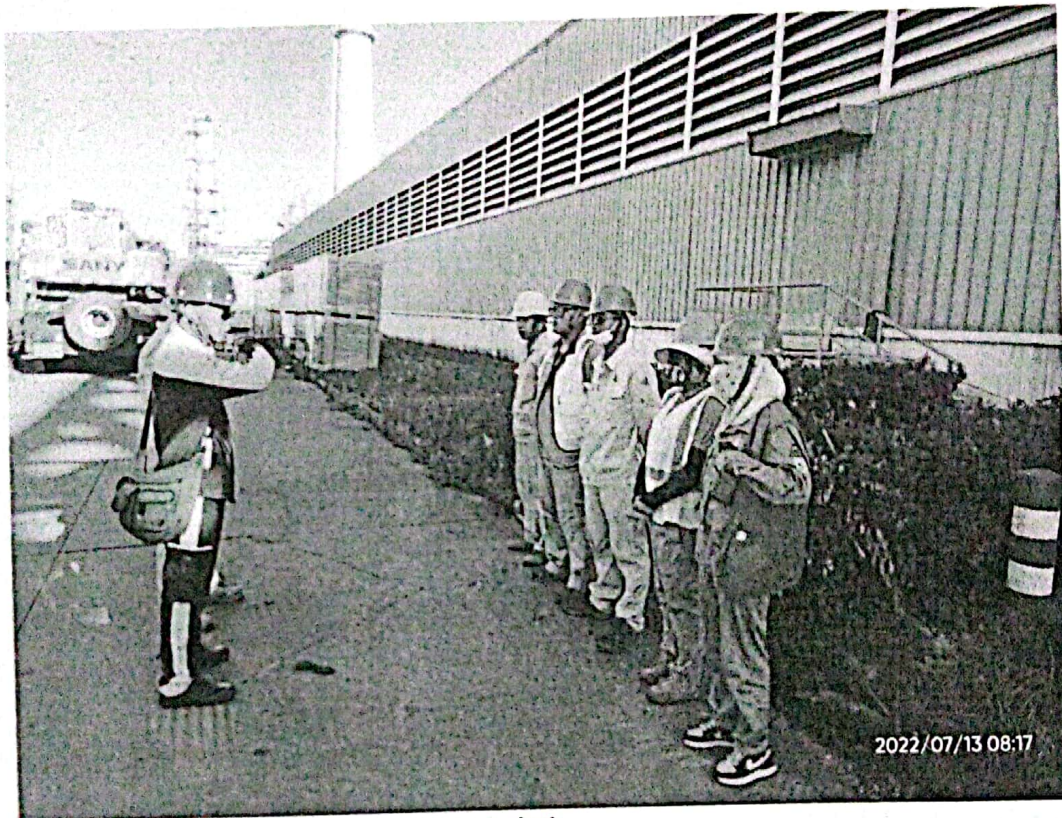

吊装前安全交底







● 海南炼化3.8MWp分布式光伏电站  
项目

施工内容: 聚丙烯仓库屋面光伏组件吊运监  
理六安全旁站

监理责任人: :

拍摄时间: 2022.07.13 15:51

天气: 多云 26°C 东南风1级 气压  
1001百帕

地点: 儋州市·洋浦海南炼化化工有限  
公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 石家庄科林电气设备有限公司

今日水印  
—相机—

真实时间

设备 ZBLRLA489261W



扫描全能王 创建
