

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-022

现场工作内容		光伏区箱逆变一体机吊装就位。	
作业地点		光伏区 11#、10#、4#、5#箱逆变现场。	
作业项目 主要危险分析		1、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 2、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 3、吊机配合不协调 4、起吊时出现瞬间强风。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	现场吊装作业 8 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意吊装就位，现场施工安全处于可控状态。	
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。	
	安全措施	工人佩戴安全帽、安全警戒线防护已到位、吊装工具牢靠合格、特种人员操作证合格有效、现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。	
现场主要问题	整改结果： 无安全隐患。		监理有关措施
			复验意见：
旁站时间	开始	2022 年 12 月 10 日 8 时 40 分	对应作业
	结束	2022 年 12 月 10 日 11 时 25 分	
		开始旁站时现场作业正常	
		结束旁站时现场作业正常	




旁站监理人员（签名）：田国栋

施工负责人（签名）：

彭纪磊



扫描全能王 创建

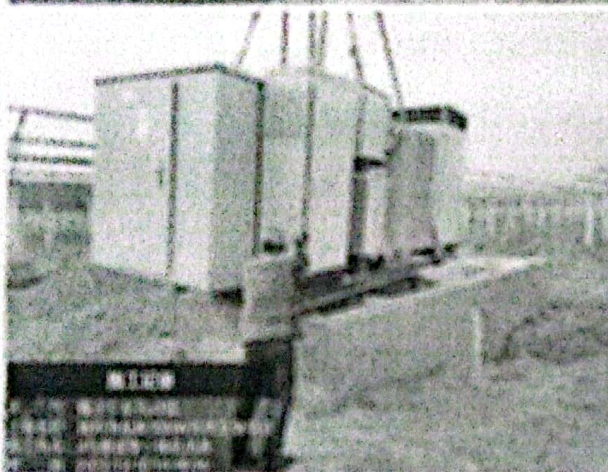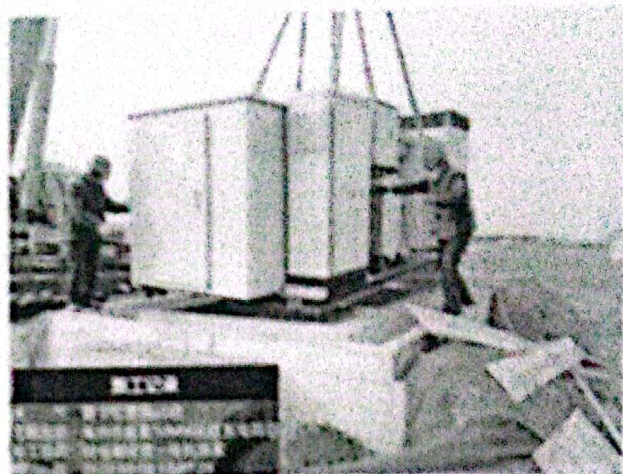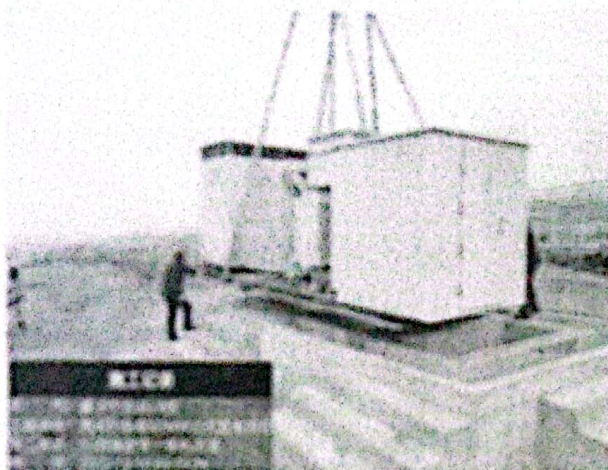

4#箱变一体机吊装就位

4#箱变一体机吊装就位

