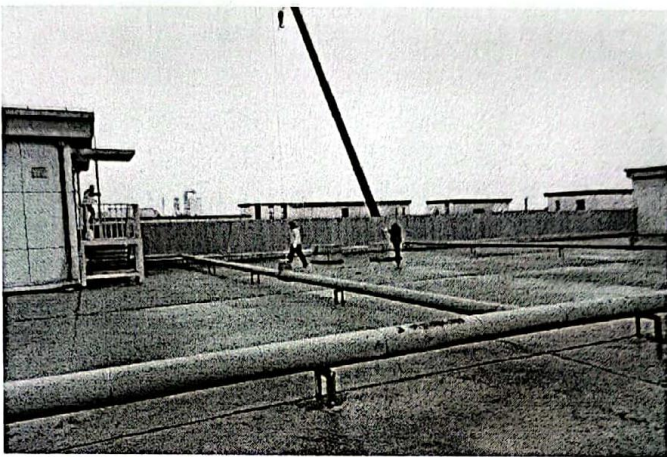


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220124

现场工作内容		数字产业经济园（一期）18#、19#和 21#屋顶支墩和支架吊运	
作业地点		园区 18#、19#和 21#楼屋顶	
			
作业项目主要 危险分析		园区 18#、19#和 21#楼屋顶吊运支墩和支架易散落。	
施工现场	组织 管理	20 名施工人员；管理人员 3 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	安全 文明 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度达较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。	
	施工 评价 措施	要求工人佩戴安全帽，行走时注意屋顶消防管道的磕拌。	
现场 主要 问题		施工区域司吊人员和司索人员配合不默契。个别员工安全帽没佩戴。	要求司吊人员和司索人员配合好，明确口令后进行下一步动作。做好个人安全防护。
		整改结果： 已整改	复验意见： 经复查，已闭环
旁站 时间	开始	2022 年 01 月 24 日 8 时 30 分	对应 作业
	结束	2022 年 01 月 24 日 11 时 00 分	吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

王中齐
