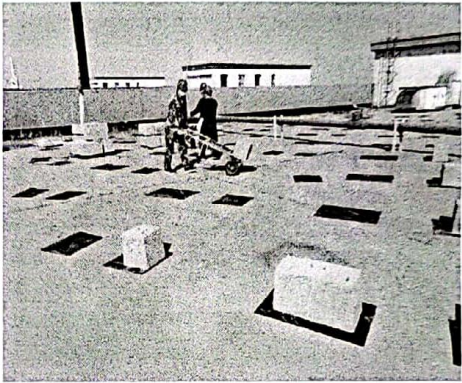
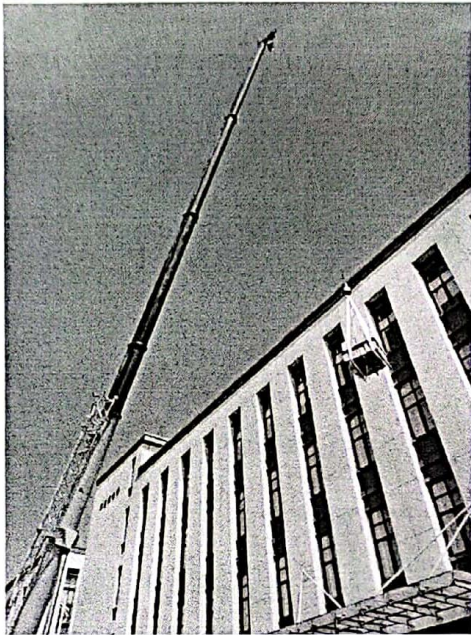


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJJYQ-AQPZ-20220404

现场工作内容		数字产业经济园（一期）23#和 24#屋顶支墩和支架吊运	
作业地点		园区 23#和 24#楼屋顶 	
作业项目 主要风险分析		园区 23#和 24#楼屋顶吊运支墩和支架易散落。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	10 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度达较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。	
	安全措施	工人佩戴安全帽，行走时注意屋顶消防管道的磕拌。	
现场主要问题	施工区域无设置安全警示标语		要求施工方在吊运施工区域拉警戒线及警示标语
	整改结果： 已整改		复验意见： 经复查，已闭环。
旁站时间	开始	2022 年 04 月 04 日 13 时 00 分	对应作业 吊运施工开始
	结束	2022 年 04 月 04 日 16 时 30 分	吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

薛平

作业负责人（签名）：

王中齐
