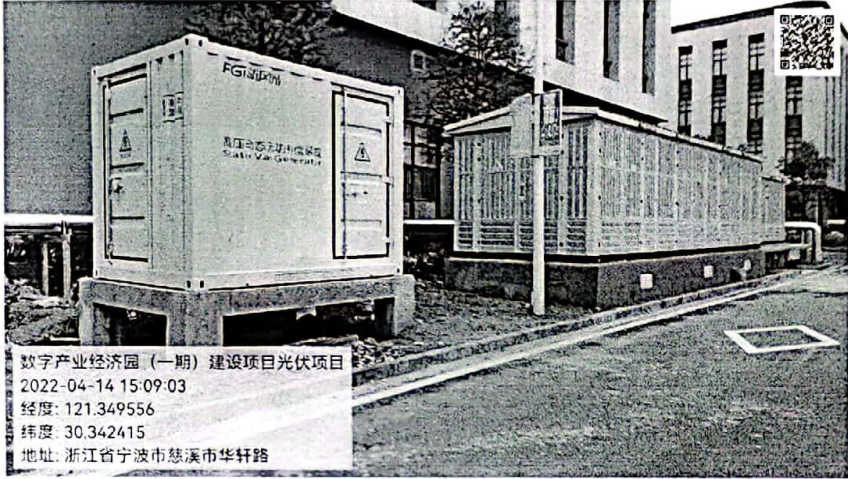


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220414

现场工作内容		数字产业经济园（一期）1#和 2#SVG 吊运	
作业地点		园区 1#和 2#SVG 基础处 	
		数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-14 15:09:03 经度: 121.349556 纬度: 30.342415 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路	
作业项目 主要危险分析		园区 1#和 2#SVG 吊钩易脱落。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	14 名施工人员；管理人员 3 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	卸货就位处为混凝土基础，卸货处至就位处中间有绿化带，吊运作业两端设置安全警示，无人员和其他车辆进入危险。	
	安全措施	工人佩戴安全帽，行走时注意绿植的磕拌。所有人员统一听从专人指挥。	
现场主要问题	无		无
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站时间	开始	2022 年 04 月 14 日 13 时 00 分	对应作业
	结束	2022 年 04 月 14 日 15 时 30 分	吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

陈

作业负责人（签名）：

王中齐
