



现场工作内容	配电室一次二次设备吊装		
作业地点			
作业项目 主要风险分析	高空坠落；过往车辆		
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机；作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。屋面不准堆积存放。	
现场主要问题		无	监理 有关 措施 复验意见：无
	整改结果：	无	
旁站 时间	开始	2022 年 06 月 23 日 9:00 时	对应 作业
	结束	2022 年 06 月 23 日 17:00 时	

旁站监理人员（签名）：

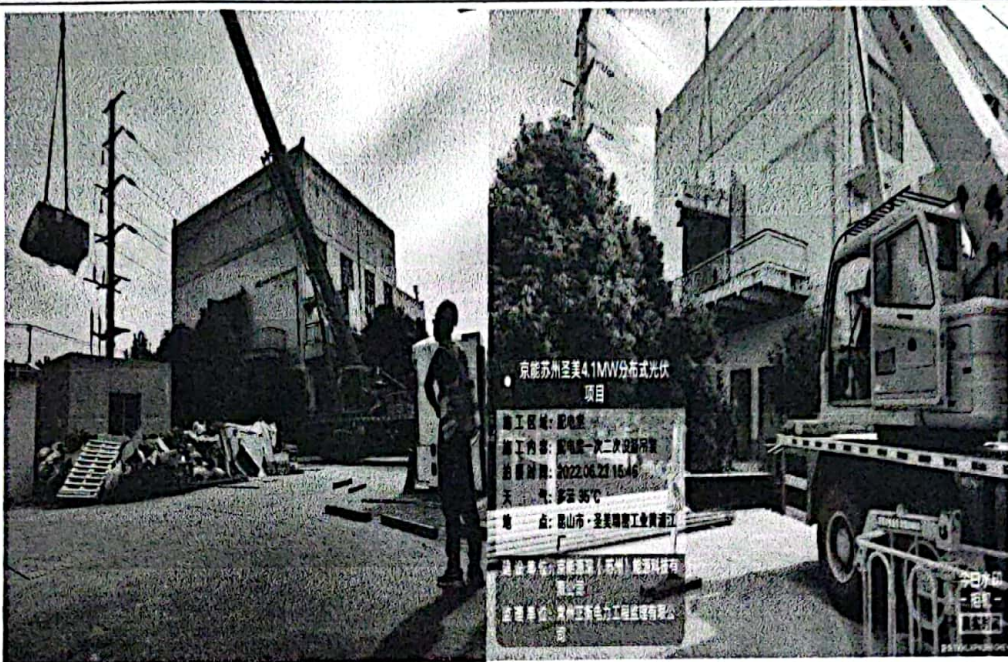

作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

