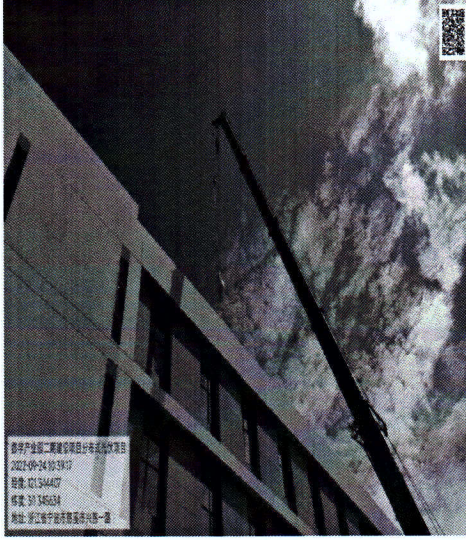


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-010

现场工作内容		智能终端产业园区二期项目 23#、29#、32#、33#屋顶支架吊运			
作业地点		园区 23#、29#、32#、33#屋顶  			
作业项目 主要危险分析		园区 23#、29#、32#、33#屋顶吊运支架易散落			
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	管理人员 2 人、安全人员 1 人、施工人员 16 人；已落实安全技术交底；已落 实施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。			
	平面 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危 险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全 措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、 高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。			
现场 主要 问题	符合安全文明施工规定		监理 有关 措施	落实到位	
	整改结果： 无			复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2022 年 10 月 03 日 14 时 30 分		对应 作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 10 月 03 日 18 时 00 分			吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：刘晨瑞

作业负责人（签名）：李超
