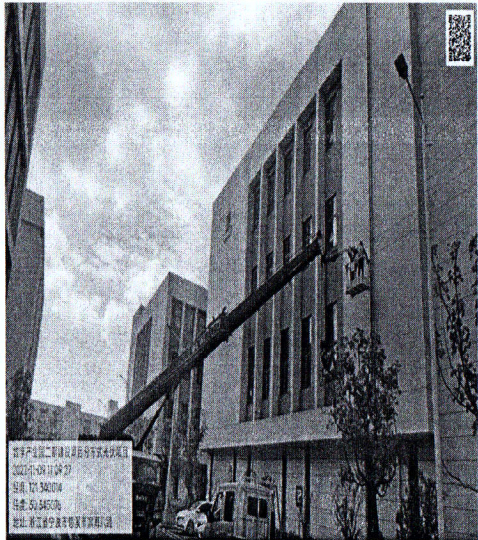


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-20221109

现场工作内容		智能终端产业园区二期项目 24#、4#、8#、7#屋顶下引桥架安装			
作业地点		园区 24#、4#、8#、7#屋顶  			
作业项目 主要风险分析		园区 24#、4#、8#、7#屋顶外侧桥架及配件易散落。			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	管理人员 2 人、安全人员 1 人、施工人员 4 人；施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底；已落实施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。			
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员和安装桥架人员均在吊篮中，地面配合和安全警戒各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、安全带，穿好工作服，注意楼栋间绿植和杂物磕碰。			
现场主要问题	符合安全文明施工规定		监理有关措施	落实到位	
	整改结果： 无			复验意见： 无	
旁站时间	开始	2022 年 11 月 09 日 09 时 00 分	对应作业	吊运安装施工开始	
	结束	2022 年 11 月 09 日 16 时 00 分		吊运安装施工结束	

旁站监理人员（签名）：刘瑞瑞

作业负责人（签名）：李超
