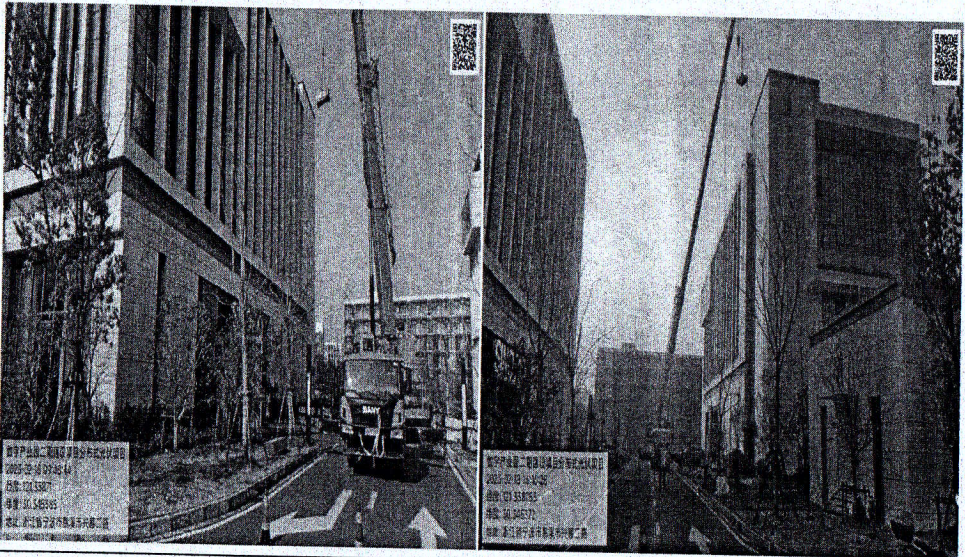





安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-20230218

现场工作内容		智能终端产业园区二期项目 35#、36#屋顶支墩、支架、光伏组件、接地扁钢吊运			
作业地点		园区 35#、36#屋顶			
					
作业项目 主要危险分析		园区 35#、36#屋顶吊运支墩、支架、接地扁钢易散落；组件吊运，因磕碰包装破损后易导致组件受损。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	管理人员 2 人、安全人员 1 人、施工人员 9 人；已落实安全技术交底；已落实施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。			
	平面 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全 措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，杜绝违章作业，组件起钩和落下要求平稳和轻放，组件及包装不允许受外力碰撞和挤压。			
现场 主要 问题	施工区域未设置安全警示标识		监理 有关 措施	要求施工方在施工区域拉警戒线及警示标识	
	整改结果： 			复验意见： 	
旁站 时间	开始	2023 年 02 月 18 日 09 时 00 分		对应 作业	吊运施工开始
	结束	2023 年 02 月 18 日 16 时 30 分			吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：
