

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：



旁站关键部位、关键工序	6号箱变-C10上塔 高压电缆敷设完成后 巡视检查	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年8月20日 8时30分	旁站结束时间	2024年8月20日 13时30分
天气情况	晴	气温	18℃~31℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

高压电缆敷设作业施工单位投入小型挖机 1 辆。施工作业人员共 12 人。施工人员已佩戴安全帽，作业区设置安全标示牌，现场已做好安全防护措施，已配备专业安全员。首先施工单位安排挖机开挖电缆沟道至-1.8m；沟内铺砂 100mm，转角处皆放置滑轮。电缆头均做保护措施；敷设完成后铺砂 100mm 并盖砖处理。预埋深度符合规范要求。

监理情况：

高压电缆敷设作业时，监理人员已检查高压电缆表面无破损，高压电缆进场有出厂合格证明等质保文件。高压电缆敷设前监理人员对电缆沟深度、铺砂深度进行检查，均符合设计、规范要求。敷设完成后再进行铺砂、盖砖。要求施工单位按照图纸设计要求进行作业，并要求现场工人做好安全防护措施。高压电缆敷设作业过程中安全及质量情况正常。

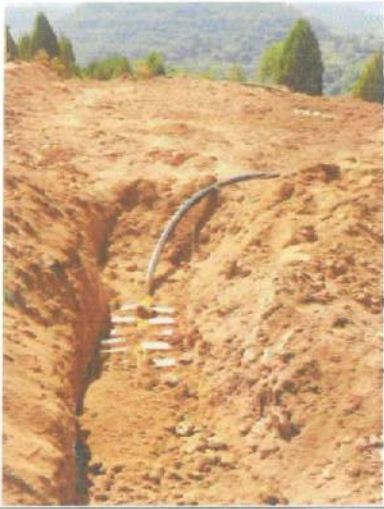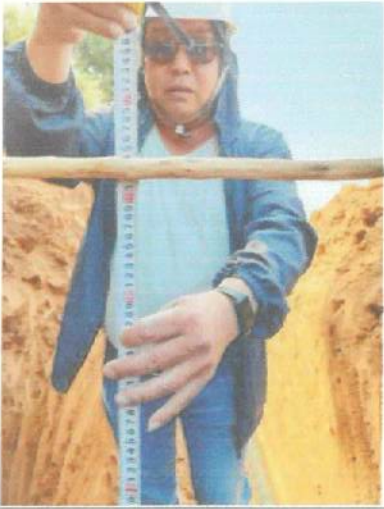

发现的问题及处理情况：

监理人员现场巡查发现有施工人员未佩戴安全帽，已要求佩戴整齐。

旁站监理人员（签字）： 王孝金

日 期： 2024.8.20
