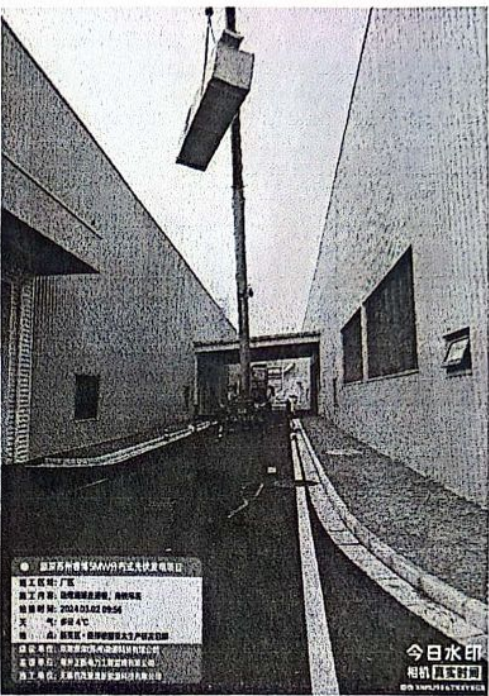
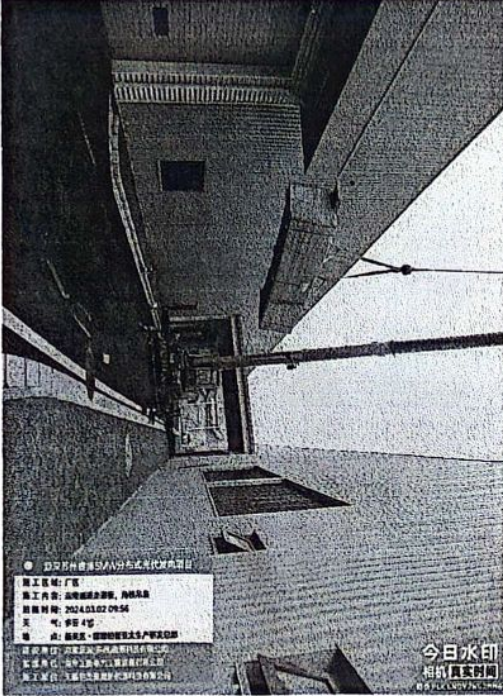


安全旁站检查记录表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-PZ-001

现场工作内容		E1、E2 导轨、走道板、角铁吊装	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	17 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2024 年 03 月 02 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 03 月 02 日 11 时	

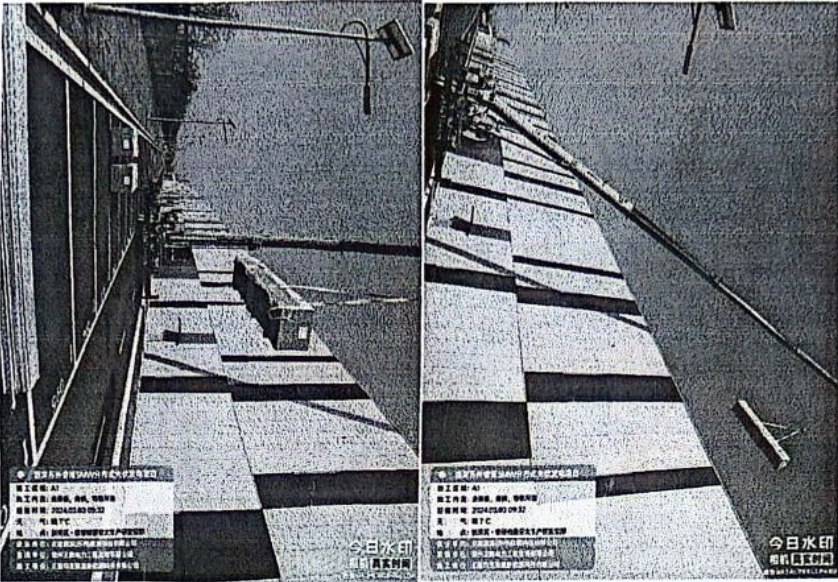
旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

安全旁站检查记录表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-PZ-002

现场工作内容	A1 导轨、走道板、角铁吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	7 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题		整改结果：	监理 有关 措施	
			复验意见：	
旁站 时间	开始	2024 年 03 月 03 日 8 时	对应 作业	
	结束	2024 年 03 月 03 日 11 时		

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

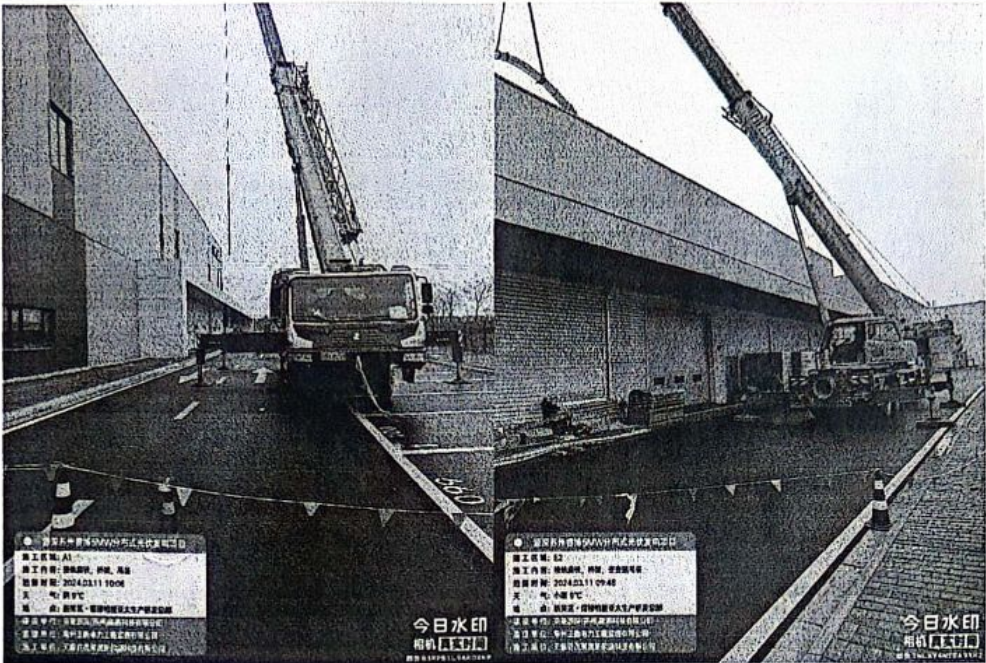





安全旁站检查记录表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-PZ-003

现场工作内容	A1、E1、E2 桥架、接地扁铁、逆变器、组件吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	25 名施工人员及 2 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题			监 理 有 关 措 施	复 验 意 见：
	整改结果：			
旁站 时间	开始	2024 年 03 月 11 日 8 时	对应 作业	
	结束	2024 年 03 月 11 日 17 时		

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

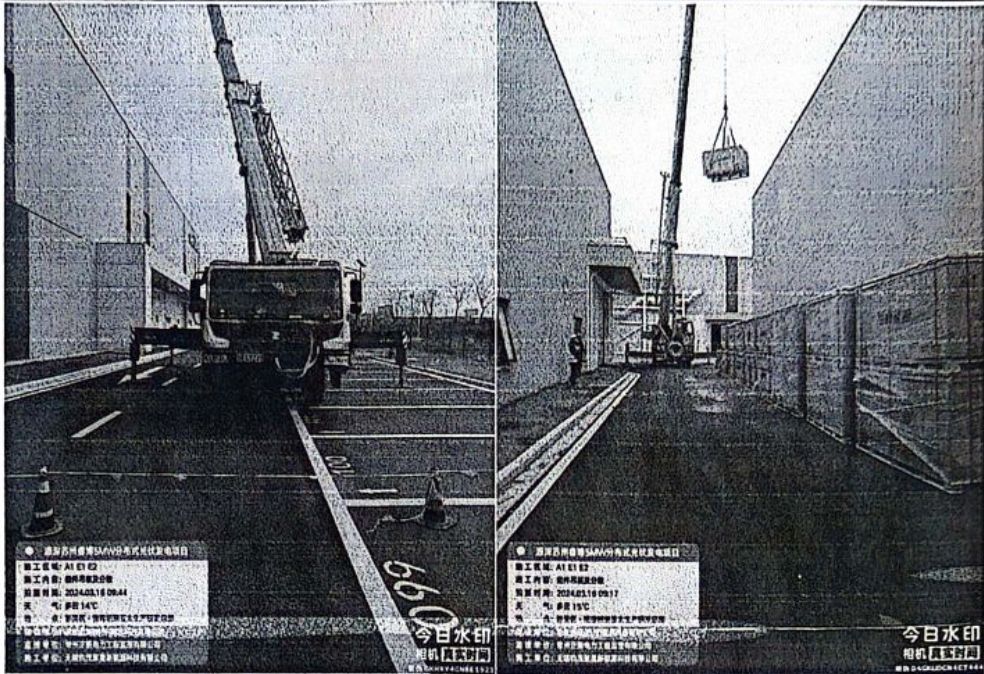




安全旁站检查记录表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-PZ-004

现场工作内容		A1、E1、E2 组件吊装	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	30 名施工人员及 2 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 03 月 16 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 03 月 16 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

王

作业负责人（签名）：

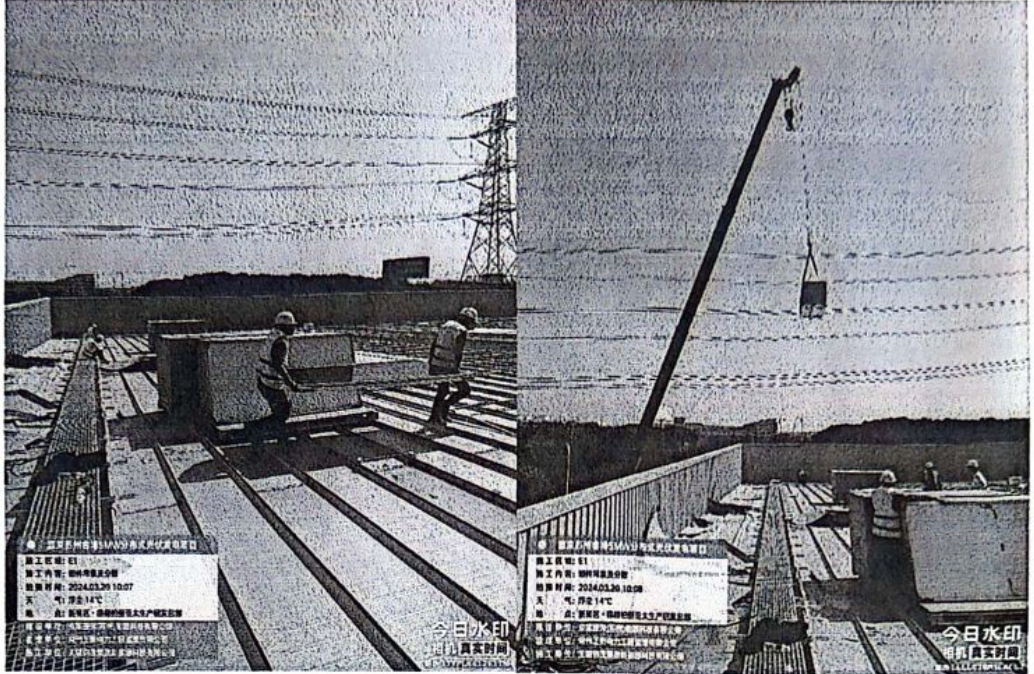
王




安全旁站检查记录表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-PZ-005

现场工作内容	E1 组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6 名施工人员及 1 名吊装车司机；作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关 措施 复验意见： 
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2024 年 03 月 20 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 03 月 20 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：





扫描全能王 创建

安全旁站检查记录表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-PZ-006

现场工作内容	A1 组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	22 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 台叉车司机；作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		无	监理有关措施 无 复验意见：无
	整改结果：	无	
旁站时间	开始	2024 年 03 月 22 日 13 时	对应作业
	结束	2024 年 03 月 22 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

[Signature]

作业负责人（签名）：

[Signature]

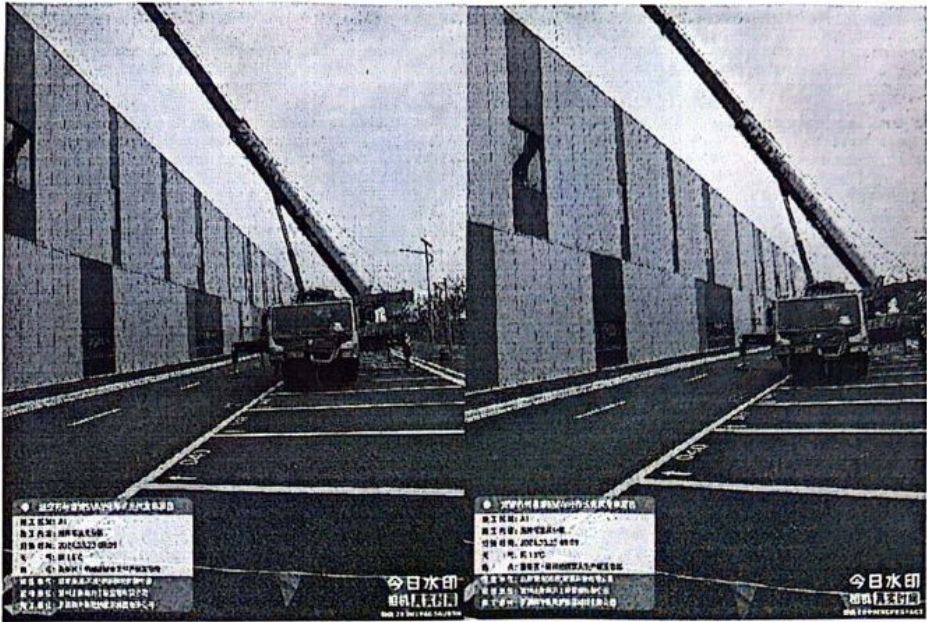


扫描全能王 创建

安全旁站检查记录表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-PZ-007

现场工作内容	A1 组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	20 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 03 月 23 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 03 月 23 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

[Handwritten signature]

作业负责人（签名）：

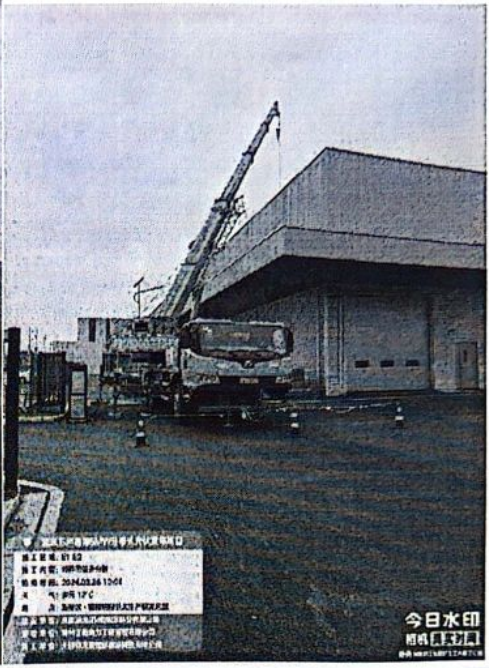
[Handwritten signature]



安全旁站检查记录表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-PZ-008

现场工作内容		E1、E2 组件吊装	
作业地点			
作业项目	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	12 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		整改结果：	监理有关措施
			复验意见：
旁站时间	开始	2024 年 03 月 26 日 8 时	对应作业
	结束	2024 年 03 月 26 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

[Signature]

作业负责人（签名）：

[Signature]

