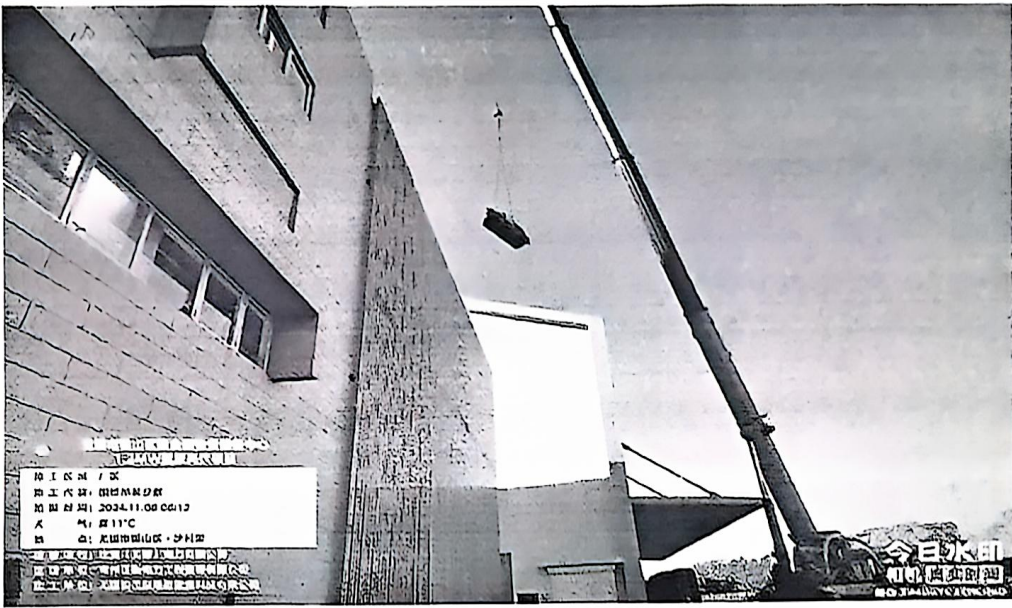


安全旁站检查记录表

工程名称： 铜山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号： BKWX-CZZH-PZ-001

现场工作内容		围栏材料吊装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	3 名施工人员及 1 名吊装车司机，作业看板内容齐全， 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 11 月 08 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 11 月 08 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

安全旁站检查记录表

工程名称： 锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目


编号： BKWX-CZZH-PZ-002

现场工作内容		支架材料吊装	
作业地点	 无锡市锡山区粮食和物资储备中心 1/2MW屋顶光伏项目 施工区域：厂区 施工内容：支架吊装 拍摄时间：2024.11.21 13:39 天气：晴 15℃ 地点：无锡市锡山区·340省道 建设单位：江苏（无锡）光伏有限公司 监理单位：苏州正泰电力工程监理有限公司 施工单位：无锡乾阳新能源科技有限公司		
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	6名施工人员及1名吊装车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关措施
	整改结果：	复验意见：	
旁站时间	开始	2024 年 11 月 21 日 13 时	对应作业
	结束	2024 年 11 月 21 日 15 时	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



安全旁站检查记录表

工程名称： 锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号： BKWX-CZZH-PZ-003

现场工作内容		桥架接地扁铁材料吊装	
作业地点	 施工区域：厂顶 施工内容：桥架接地扁铁吊装 拍摄时间：2024.11.26 13:33 天气：晴 10℃ 地点：无锡市锡山区·沙村街		
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	6名施工人员及1名吊装车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024年 11月 26日 13时	对应 作业
	结束	2024年 11月 26日 16时	

旁站监理人员（签名）：
姜旭

作业负责人（签名）：
厉建成

安全旁站检查记录表

工程名称： 锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目


编号： BKWX-CZZH-PZ-004

现场工作内容		组件吊装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	6名施工人员及1名吊装车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关 措施
	整改结果： 		
旁站 时间	开始	2024 年 11 月 29 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 11 月 29 日 10 时	
		复验意见： 	

旁站监理人员（签名）：




作业负责人（签名）：



安全旁站检查记录表

工程名称： 锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号： BKWX-CZZH-PZ-005

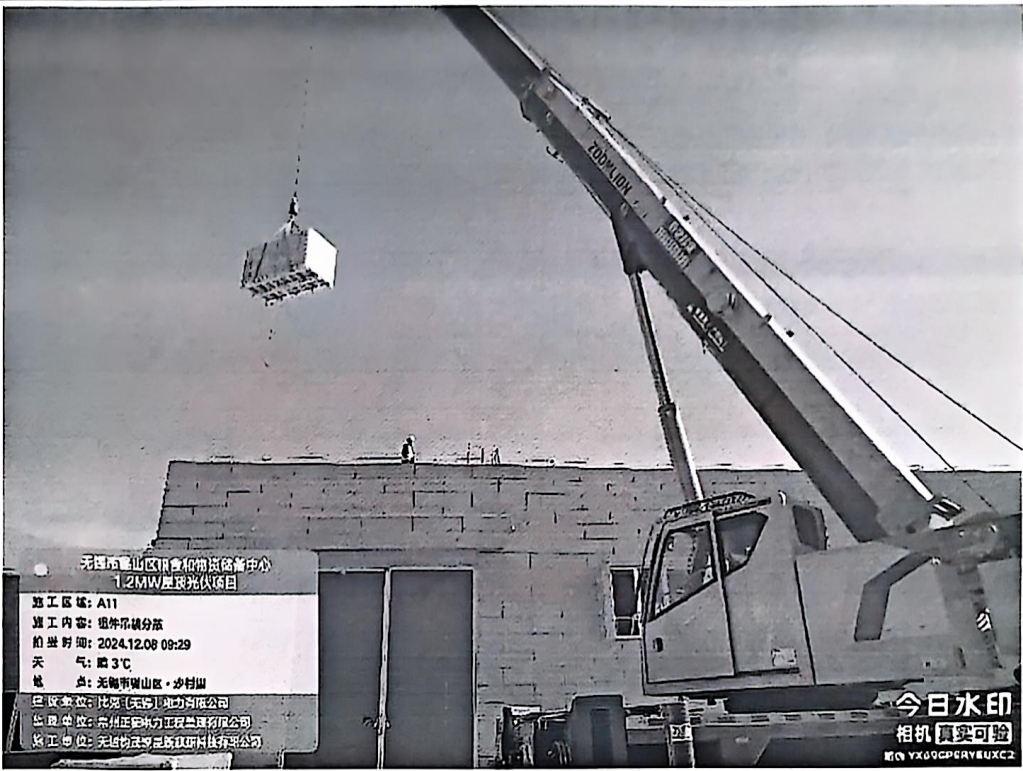现场工作内容		组件吊装	
作业地点			
作业项目	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	7名施工人员及1名吊装车司机1名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站时间	开始	2024 年 12 月 08 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 12 月 08 日 15 时	

旁站监理人员（签名）：

李心

作业负责人（签名）：

厉建成

安全旁站检查记录表

工程名称： 锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-PZ-006

现场工作内容		支架逆变器吊装	
作业地点		 施工区域: B1 施工内容: 支架逆变器吊装 拍摄时间: 2024.12.11 13:07 天气: 阴 7℃ 地点: 无锡市锡山区·沙村 监理单位: 江苏华电工程咨询有限公司 施工单位: 无锡华电电力工程有限公司 安全监理单位: 无锡华电电力工程有限公司 今日水印 相机水印可验 80157141 990113004	
作业项目 主要风险分析		高空坠落：过往车辆：	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	7 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		整改结果：	复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 12 月 11 日 13 时	对应 作业
	结束	2024 年 12 月 11 日 14 时	

旁站监理人员（签名）：

姜


作业负责人（签名）：

厉建成

安全旁站检查记录表

工程名称： 锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-PZ-007

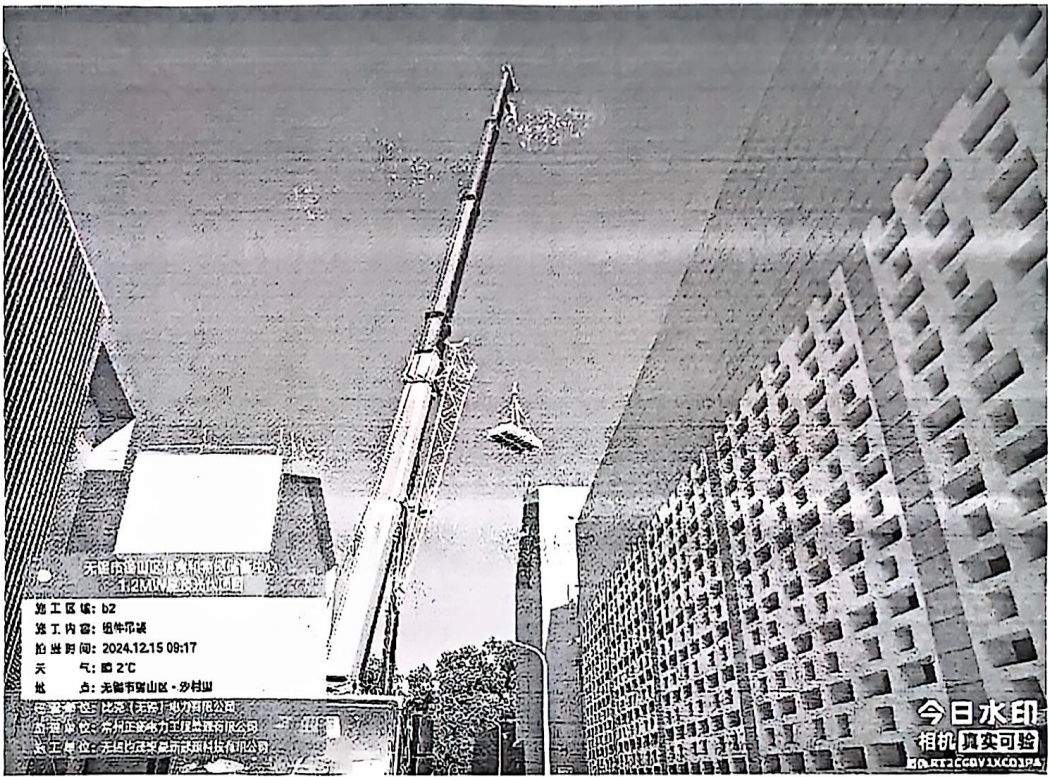现场工作内容		组件吊装	
作业地点	 无锡尚德太阳能电力有限公司 施工区域: b2 施工内容: 组件吊装 拍摄时间: 2024.12.15 09:17 天气: 晴 2℃ 地点: 无锡市锡山区·沙村山 监理单位: 江苏华电工程咨询有限公司 施工单位: 无锡尚德太阳能电力有限公司		
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	9名施工人员及1名吊装车司机1名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关措施
	整改结果： 		
旁站时间	开始	2024 年 12 月 15 日 8 时	对应作业
	结束	2024 年 12 月 15 日 16 时	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

