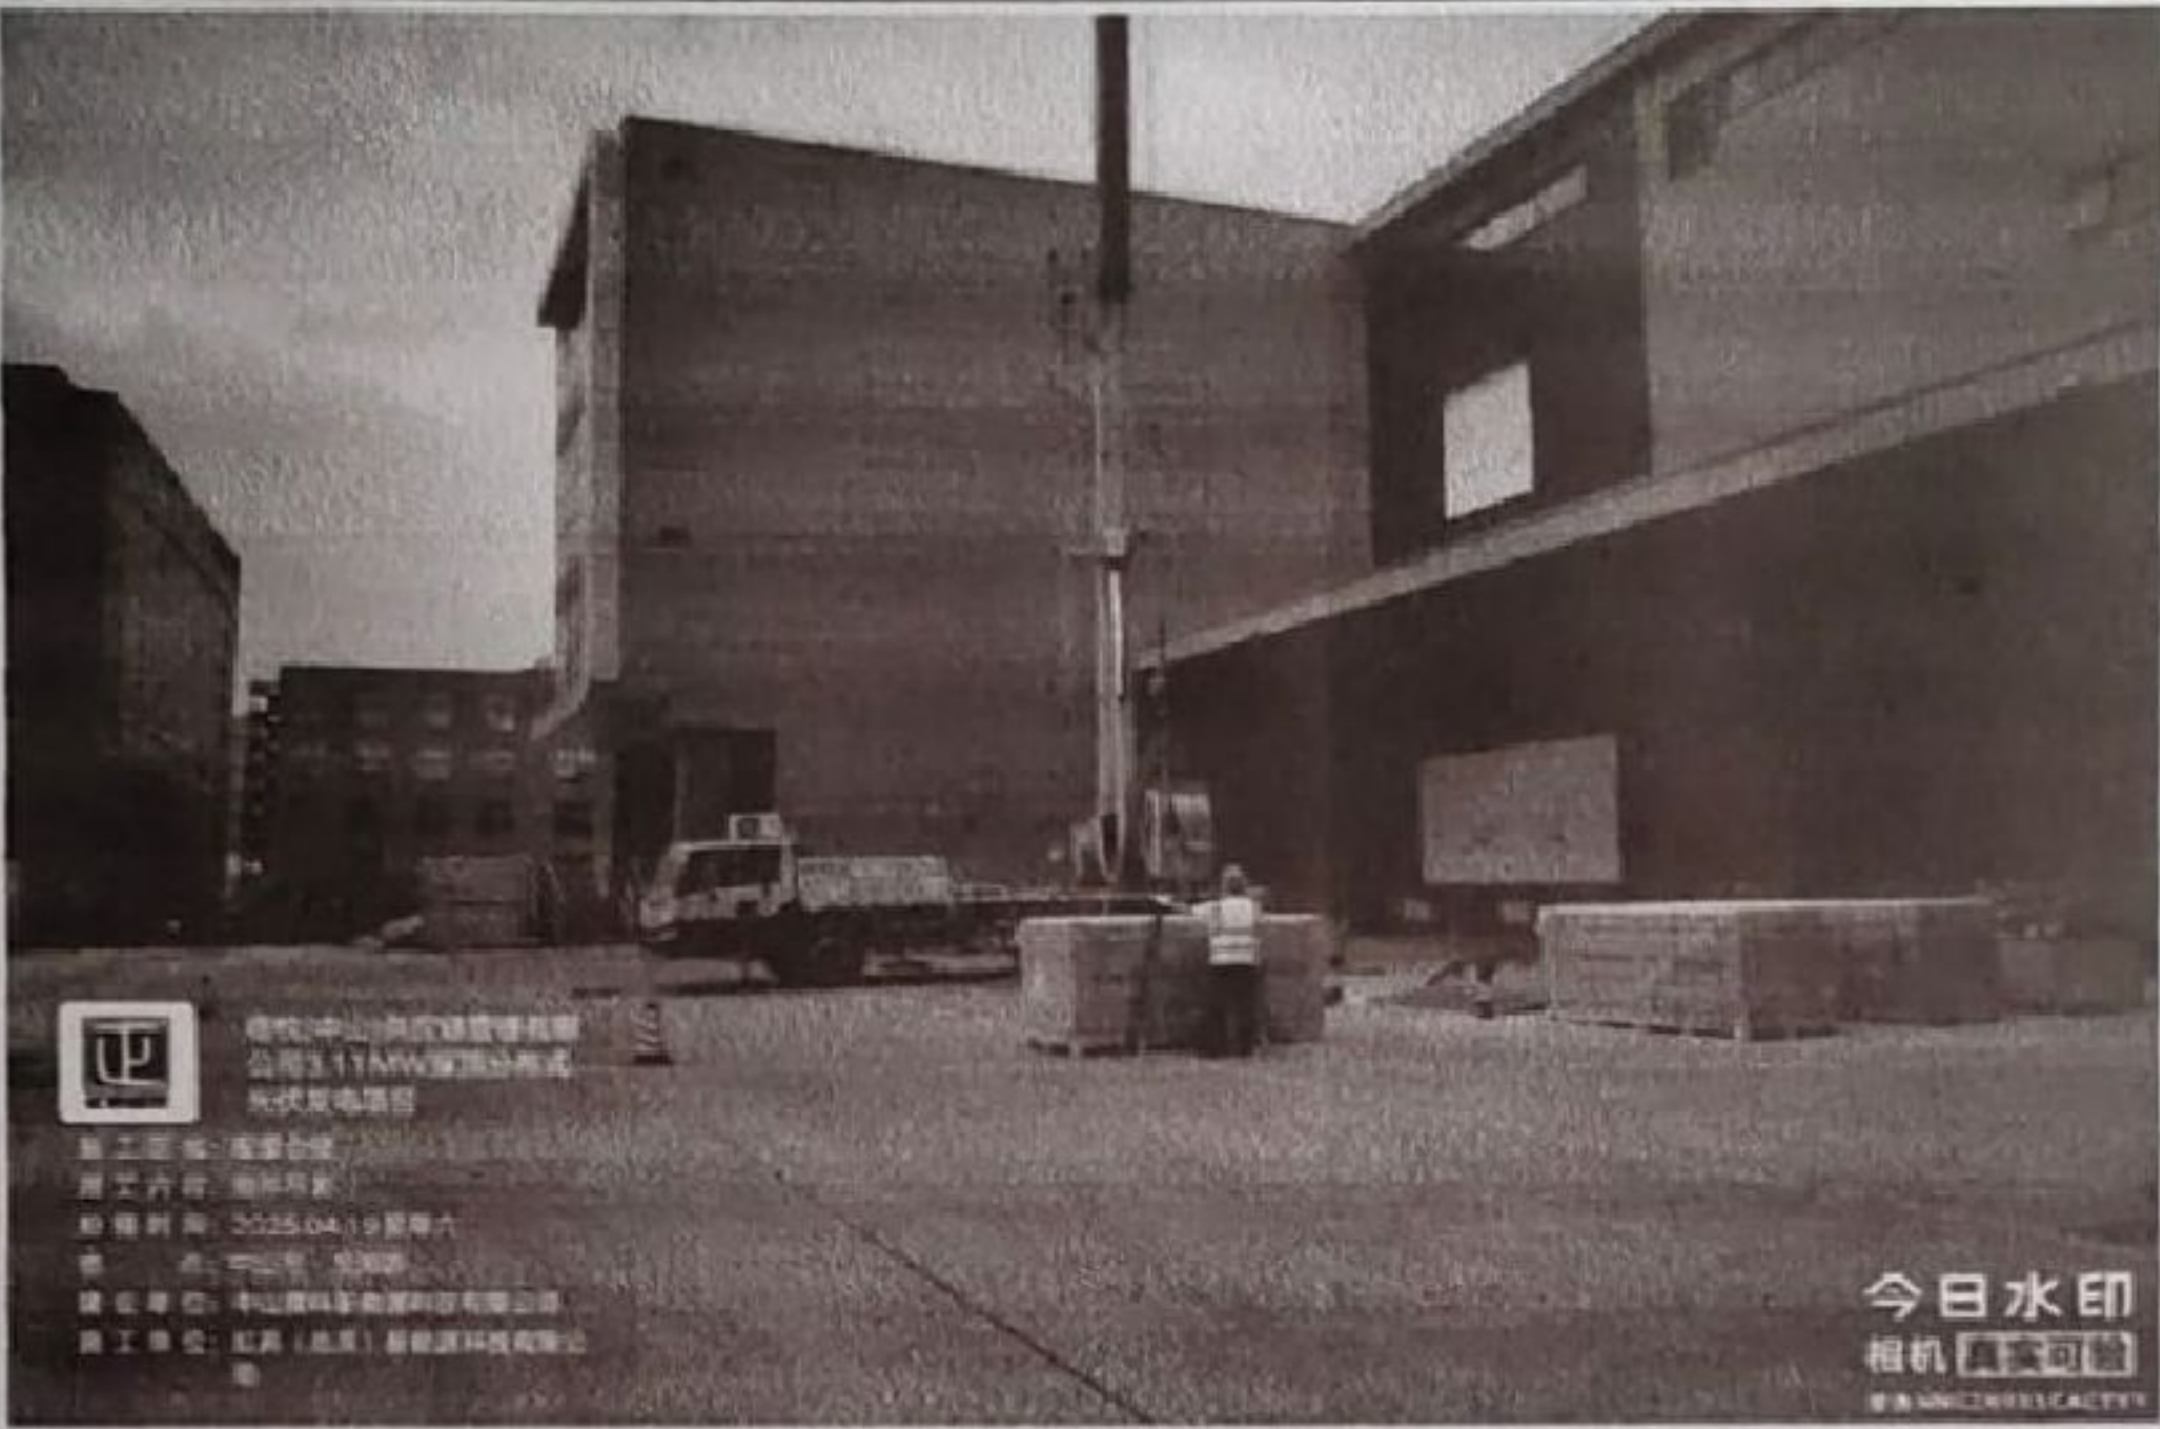



安全旁站记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GRGF-CZZH-AQPZ-005

现场工作内容	配套仓储组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全 文明施工 施工评价	组织管理	12 名施工人员、1 名吊装车司机及 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	现场吊装区域未拉设警戒带。		监理 有关 措施
	整改结果： 暂停吊装施工进行整改。		
旁站 时间	开始	2025 年 04 月 19 日 13 时 30 分	对应 作业
	结束	2025 年 04 月 19 日 17 时 00 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注：1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的各项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

