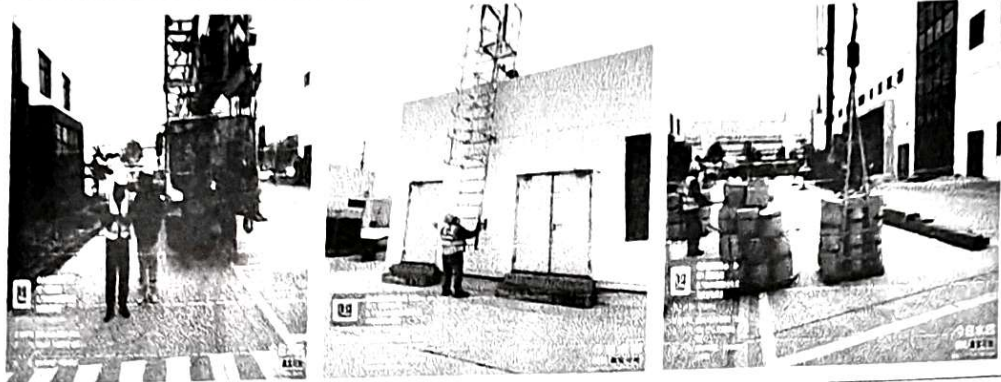


表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWSP-CZZH-PZ-A20-001

现场工作内容	1、2 号楼水泥墩、爬梯、导轨吊装、立柱吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机 1 名信号工。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	水泥墩吊装防止掉落	监理 有关 措施	要求对吊装水泥墩进行绑扎	
	整改结果：已整改		复验意见：整改完成	
旁站 时间	开始	2025 年 3 月 29 日 8 时	对应 作业	正常
	结束	2025 年 3 月 29 日 19 时		正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：周飞

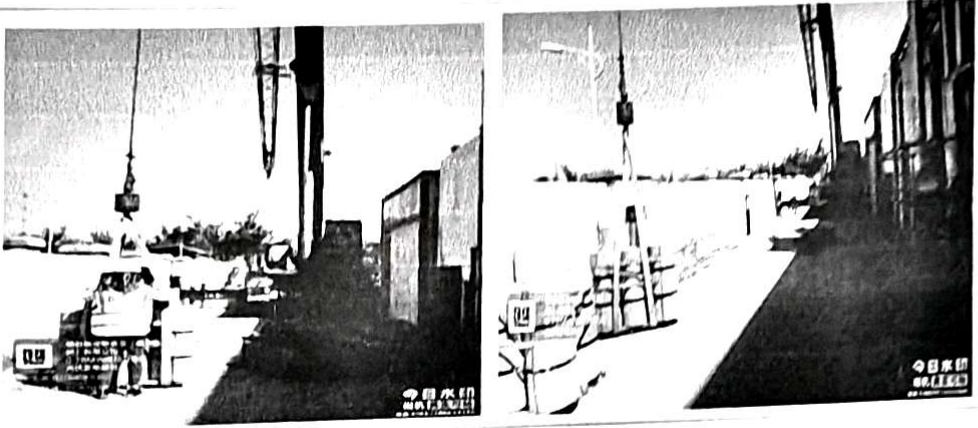
注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWSP-CZZH-PZ-A20-002

现场工作内容	2 号楼水泥墩、爬梯、导轨吊装、立柱、安全网片吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机 1 名信号工。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	无	无	无
	整改结果：		
旁站时间	开始	2025 年 4 月 6 日 12:30	对应作业
	结束	2025 年 4 月 6 日 16:15	
旁站		正常	正常
旁站		正常	正常

作业负责人（签名）：周飞

旁站监理人员（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWSP-CZZH-PZ-A20-003

现场工作内容	2 号楼组件、接地扁钢、吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机 1 名信号工。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	无	监理 有关 措施	无	
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2025 年 4 月 9 日 09:30	对应 作业	正常
	结束	2025 年 4 月 9 日 12:15		正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：周平

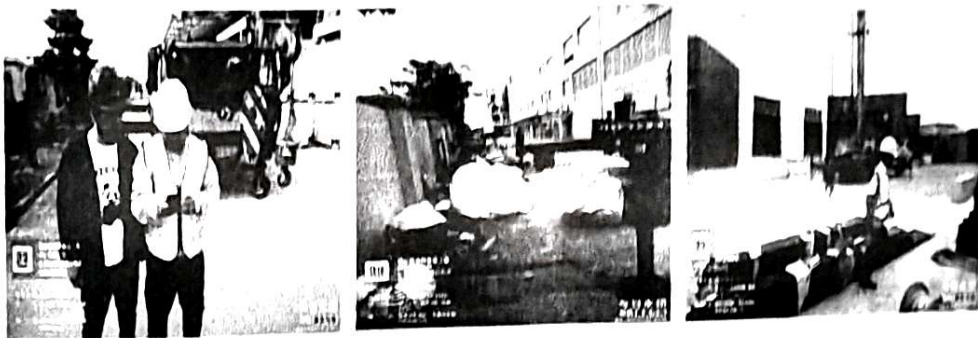
注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWSP-CZZH-PZ-A20-004

现场工作内容	1#2 号楼立柱、隔板、导轨、桥架、接地扁钢、逆变器、吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名义车司机 1 名信号工。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	无	监 理 有 关 措 施	无	
	整改结果： 无		复验意见：	
旁站 时间	开始	2025 年 4 月 24 日 08:30	对应 作业	正常
	结束	2025 年 4 月 24 日 16:15		正常

作业负责人（签名）：周平

旁站监理人员（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWSP-CZZH-PZ-A20-005

现场工作内容	1#2 号组件吊装				
作业地点					
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；				
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	8 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机 1 名信号工。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底			
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患			
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。			
现场主要问题	无	整改结果：无		监理 有关 措施	无
					复验意见：无
旁站 时间	开始	2025 年 5 月 2 日 08:00		对应 作业	正常
	结束	2025 年 5 月 2 日 09:15			正常

作业负责人（签名）：周飞

旁站监理人员（签名）：

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
