

安全旁站检查记录表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-001

现场工作内容		水泥墩、支架吊装	
作业地点		 江西翼邦生物技术有限公司717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目 施工区域：厂区 施工内容：光伏水泥墩基础吊装 拍摄时间：2025.04.28 09:00 天气：晴 18℃ 地点：鹰潭市余江区·江西翼邦生物技术有限公司 监理单位：上海舜能光伏电力有限公司 监理单位：常州正泰电力工程有限公司 施工单位：浙江中伏太阳能科技有限公司 前方施工 注意安全 今日水印 相机水印 编号 74ATPULP2GTWIC	
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	6名施工人员及1名吊装车司机；1名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2025 年 04 月 28 日 7 时	对应 作业
	结束	2025 年 04 月 28 日 18 时	

旁站监理人员（签名）：

王心

作业负责人（签名）：

陈作明

安全旁站检查记录表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-002

现场工作内容	水泥墩、支架吊装		
作业地点			
作业项目	高空坠落；过往车辆；		
主要危险分析			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	6名施工人员和1名吊装车司机；1名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站时间	开始	2025 年 04 月 29 日 7 时	对应 作业
	结束	2025 年 04 月 29 日 10 时	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

安全旁站检查记录表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-003

现场工作内容		桥架接地扁铁逆变器吊装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全， 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2025 年 05 月 06 日 7 时	对应 作业
	结束	2025 年 05 月 06 日 10 时	

旁站监理人员（签名）：

[Signature]

作业负责人（签名）：

[Signature]

安全旁站检查记录表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-004

现场工作内容		组件逆变器吊装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	9 名施工人员及 1 名吊装车司机，1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监 理 有 关 措 施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2025 年 05 月 10 日 7 时	对应 作业
	结束	2025 年 05 月 10 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



安全旁站检查记录表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目


编号：SHYS-CZZH-PZ-005

现场工作内容	下铺桥架安装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全带带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关 措施 复验意见： 
	整改结果： 		
旁站 时间	开始	2025 年 05 月 12 日 9 时	对应 作业
	结束	2025 年 05 月 12 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：




安全旁站检查记录表

工程名称: 江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号: SHYS-CZZH-PZ-006

交流电缆敷设	现场工作内容
作业地点	今日水印 相机 水印相机
主要危险分析	高空坠落；过往车辆；
评价项目	组织 8名施工工人及1名吊车司机，作业看板内容齐全。 施工工人到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。 平面布置 地面较平整，无碍方隐患 安全设施 警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意缆绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。 施工 文明 安全 现场 施工 评价
现场主要问题	整改结果: z z 有关措施 复验意见: z z
旁站时间	开始 2025年05月14日9时 结束 2025年05月14日17时 旁站 时间

安全旁站检查记录表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SHYS-CZZH-PZ-007

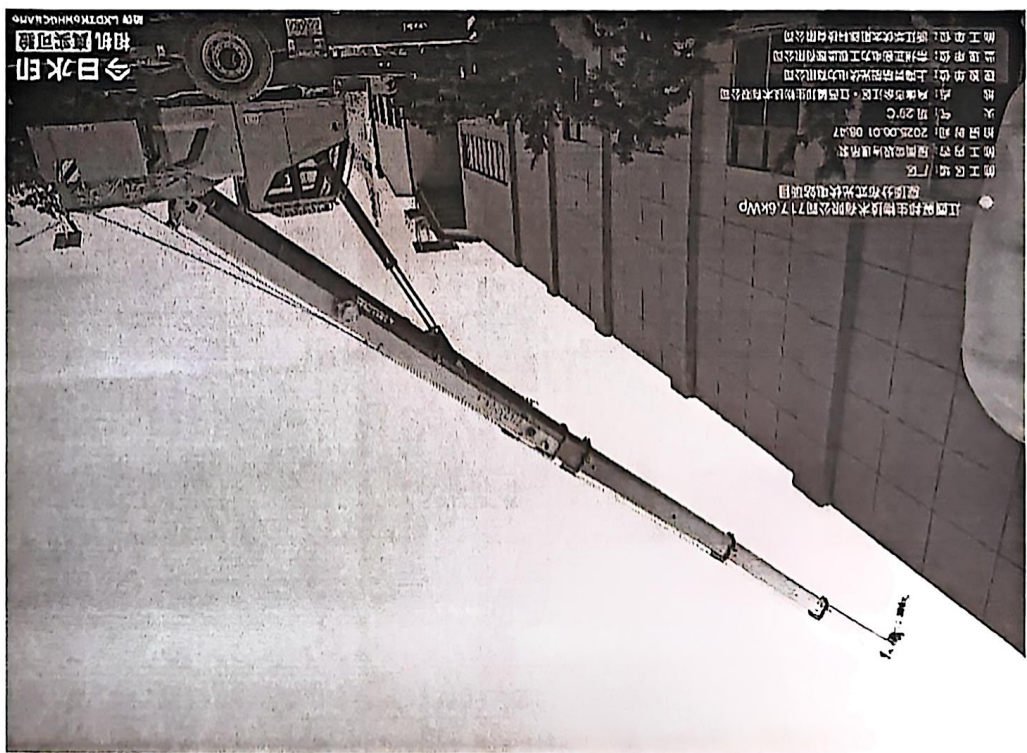现场工作内容	屋面垃圾吊装清理	
作业地点	 江西保科生物技术有限公司 71.7.6kWp 施工区域：/区 施工内容：屋顶光伏组件安装 施工时间：2025.06.01 08:37 天气：晴 29℃ 地址：景德镇市江湾·江西国际技术公司 监理单位：上海南光电力有限公司 监理单位：江西保科生物技术有限公司 施工单位：江西保科生物技术有限公司	
作业项目	高空坠落：过往车辆；	
主要危险分析	组织 8名施工人员和1名吊装车司机，作业看板内容齐全。 施工 施工人员进行入场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底 安全 平面 地面较平整，无塌方隐患 文明 布置 施工 警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	整改结果： 无 措施 无 有关 无 措施 无 监督 无 意见： 无	
旁站	开始	2025年06月01日9时
时间	结束	2025年06月01日17时
