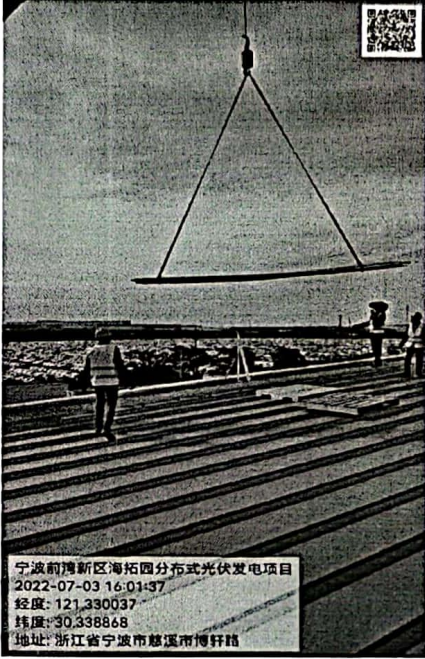


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220703

现场工作内容		海拓智创园 1#、2#和 3#厂房屋顶接地扁钢和运维通道用角钢吊运	
作业地点		 宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-07-03 16:01:37 经度: 121.330037 纬度: 30.338868 地址: 浙江省宁波市慈溪市博园路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-07-03 16:06:53 经度: 121.329848 纬度: 30.338975 地址: 浙江省宁波市慈溪市博园路	
作业项目 主要风险分析		屋顶吊运接地扁钢和运维通道用角钢易散落坠下。屋顶行走时易踩踏在采光带上导致坠落等。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	15 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	该屋顶为彩钢瓦屋顶，屋顶无女儿墙，物品和人员有从防护围栏翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。	
	安全措施	屋顶周边用钢丝绳安装防护围栏；工人正确佩戴安全防护用品；在屋顶行走通行方向采光带上方铺设木托盘，要求屋顶行走时严禁在采光带上踩踏。	
现场主要问题		无	无
		整改结果：无	复验意见：无
旁站时间	开始	2022 年 07 月 03 日 15 时 00 分	对应作业
	结束	2022 年 07 月 03 日 18 时 00 分	吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：戚平

作业负责人（签名）：郑和恩
