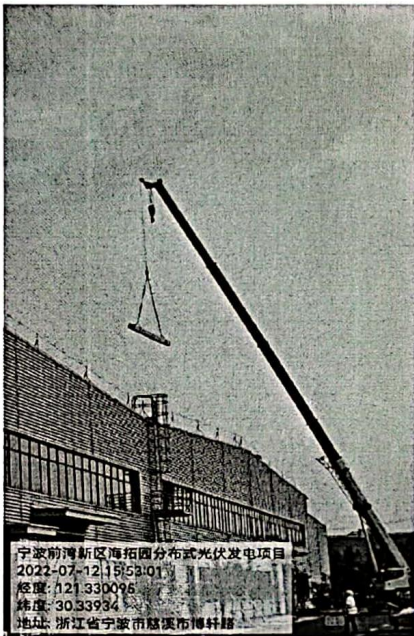


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220712

现场工作内容		海拓智创园 1#、2#和 3#厂房屋顶导轨吊运	
作业地点		 宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-07-12 15:55:40 经度: 121.330096 纬度: 30.33934 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-07-12 15:55:40 经度: 121.330096 纬度: 30.33934 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路	
		园区 1#、2#和 3#厂房屋顶	
作业项目 主要危险分析		厂房屋顶上吊运导轨易散落。人员屋顶行走时易踩踏在采光带上导致坠落等。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	15 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	该屋顶为彩钢瓦屋顶，屋顶无女儿墙，物品和人员有从防护围栏翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。	
	安全措施	屋顶周边用钢丝绳安装防护围栏；工人正确佩戴安全防护用品；在屋顶行走通行方向采光带上方铺设木托盘，屋顶行走时严禁在采光带上踩踏。	
现场主要问题	无		监理有关措施
	整改结果：无		
旁站时间	开始	2022 年 07 月 12 日 15 时 00 分	对应作业
	结束	2022 年 07 月 12 日 18 时 00 分	
		吊运施工开始	
		吊运施工结束	

旁站监理人员（签名）：戚平

作业负责人（签名）：郑和恩
