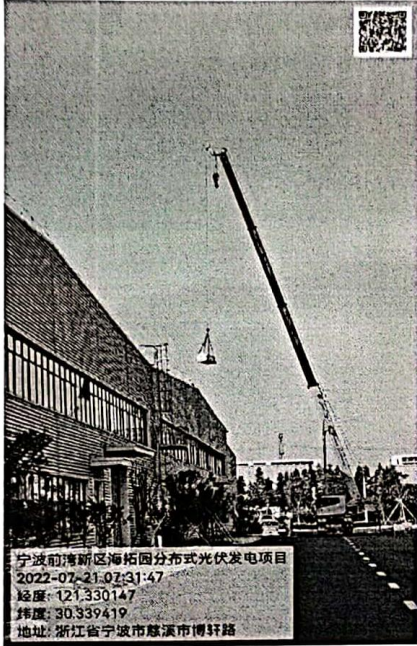
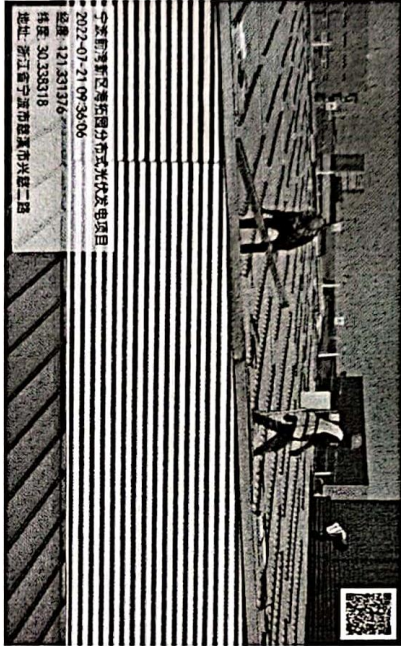


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220721

现场工作内容		海拓智创园 1#、2#和 3#厂房屋顶水平桥架和走道板吊运				
作业地点		 宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-07-21 07:31:47 经度: 121.330147 纬度: 30.339419 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-07-21 09:36:06 经度: 121.331376 纬度: 30.338318 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路				
		园区 1#、2#和 3#厂房屋顶				
作业项目 主要风险分析		厂房屋顶上吊运水平桥架和走道板易散落。人员屋顶行走时易踩踏在采光带上导致坠落等。				
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	16 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。吊运区域设置安全警示标识绳和牌。				
	平面布置	该屋顶为彩钢瓦屋顶，屋顶无女儿墙，物品和人员有从防护围栏翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。				
	安全措施	屋顶周边用钢丝绳安装防护围栏；工人正确佩戴安全防护用品；在屋顶行走通行方向采光带上方铺设木托盘，屋顶行走时严禁在采光带上踩踏。				
现场主要问题		无		监理有关措施	无	
		整改结果：无			复验意见：无	
旁站时间	开始	2022 年 07 月 12 日 7 时 00 分		对应作业	吊运施工开始	
	结束	2022 年 07 月 12 日 11 时 00 分			吊运施工结束	

旁站监理人员（签名）：戚平

作业负责人（签名）：郑和恩
