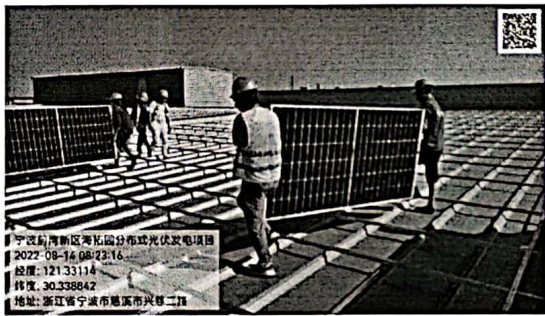
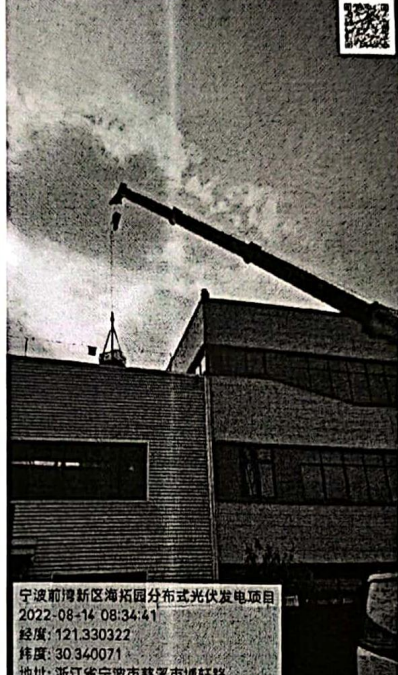


安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220814

现场工作内容		海拓智创园 1#厂房屋顶光伏组件吊运			
作业地点		园区 1#厂房屋顶			
					
					
作业项目 主要危险分析		厂房屋顶上吊运组件易散落。人员屋顶行走时易踩踏在采光带上导致坠落等。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	16 名施工人员，管理人员 2 人。吊运区域设置安全警示标识绳和牌。施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底；组件吊运至屋顶后工人立即进行拆箱把组件分散搬运至屋面。			
	平面 布置	该屋顶为彩钢瓦屋顶，屋顶无女儿墙，物品和人员有从防护围栏翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全 措施	屋顶周边用钢丝绳安装防护围栏；工人正确佩戴安全防护用品；在屋顶行走通行方向采光带上方铺设木托盘，屋顶行走时严禁在采光带上踩踏。			
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	无	
	整改结果：无			复验意见：无	
旁站 时间	开始	2022 年 08 月 14 日 7 时 30 分		对应 作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 08 月 14 日 10 时 00 分			吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

郑知恩
