

## 现场安全检查记录

- 1、现场二级配电箱接地线不规范。
- 2、现场开关箱接地体深度不够，接线不规范。
- 3、钢筋加工区过路电缆没有埋设或架空处理，存在隐患。
- 4、升压站基坑没有进行基坑临边防护。
- 5、员工食堂电源插排线接头太多，存在安全隐患。
- 6、员工宿舍检查发现有通铺现象。
- 7、办公室和宿舍的彩钢板房应做好防雷接地。
- 8、现场加工钢筋机械设备，要做好一机、一闸、一漏、一保。
- 9、现场检查应增加安全标语、标识、警示牌等。
- 10、检查 F24#、K07 基坑堆积废弃毛石太高，离基坑太近，要求及时清理。及时消除安全隐患。
- 11、检查 F22#发动机没有做接地。

常州正衡电力工程监理有限公司项目部

检查人：



赵焕超

监理项目部

2019.5.14





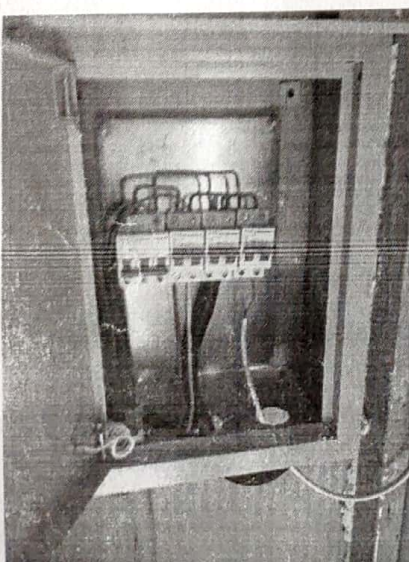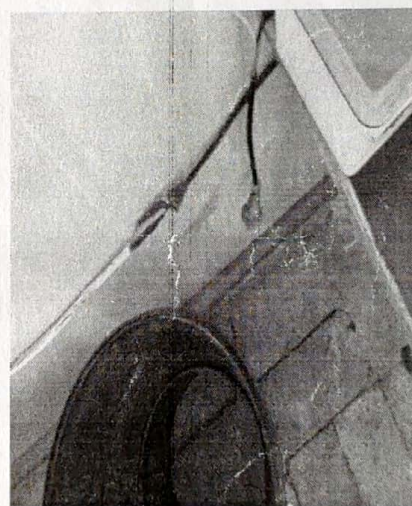



## 现场安全检查记录

- 1、升压站基坑临边防护不到位。
- 2、变压器下面周围要做硬围护，要做围挡措施。
- 3、升压站区钢筋加工区开关箱要设专人管理，开关箱未见漏电保护器，存在安全隐患。
- 4、升压站宿舍区未见防火器材，存在安全隐患，需要及时整改。
- 5、员工食堂电源插排线接头太多，存在安全隐患。
- 6、员工宿舍检查发现有通铺现象。
- 7、钢筋加工区开关箱要有防雨罩。
- 8、现场加工钢筋机械设备，要做好一机、一闸、一漏、一保。
- 9、现场检查应增加安全标语、标识、警示牌等。
- 10、宿舍临时用电只有开关未见漏电保护器。

以上问题见附图


常州正衡电力工程监理有限公司项目部

检查人：

监理项目

2019.5.22



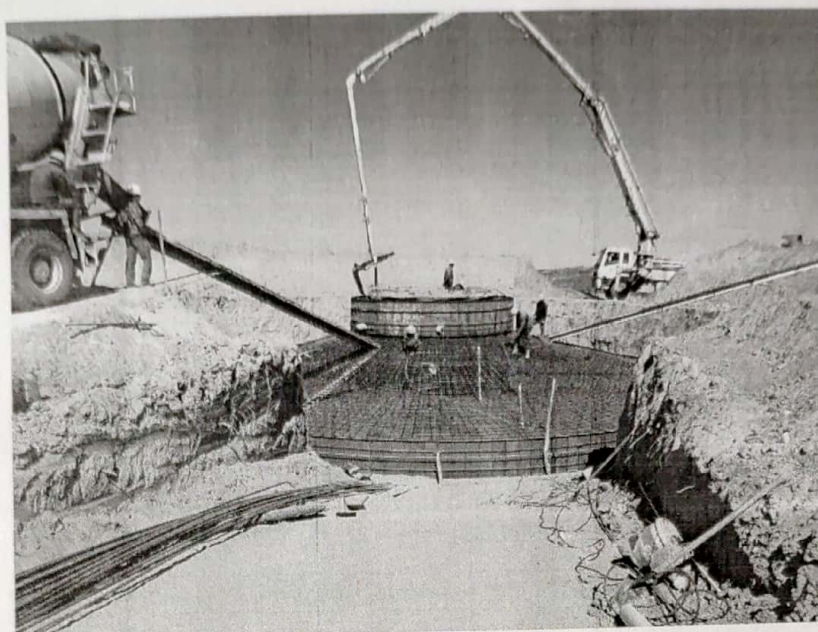

1、基坑没有临边防护





## 现场安全检查记录

- 1、现场安全检查发现 F20#基坑临边防护不到位，要求施工单位对开挖完的基坑做好临边防护工作。
- 2、现场浇筑商砼，商砼站的司机没有带安全帽，有司机在现场吸烟，要求施工单位对进场的司机做好安全管理工作。
- 3、风机基础浇筑采用溜槽施工，要有监护人。
- 4、消防和安全用品要有详细的台账。
- 5、现场安全文明施工标识、警示牌少，道路转弯处应设置限速牌、警示标识牌。
- 6、现场应设置医务室，应做好安全消防应急演练工作。
- 7、施工单位应为进场的工人购买人员保险及进行体检，体检的工人要有体检报告。
- 8、施工现场的建筑垃圾要及时清理，做到工完场地清。

以上问题见附图

常州正衡电力工程监理有限公司项目部

检查人：赵峰

监理项目部


2019.5.28



## 现场安全检查记录

- 1、生活区插线板的接线太长，易产生涡流。线径太细要求更换。
- 2、升压站生活区蓄水池门未关闭，易发生升坠落隐患。

以上问题见附图

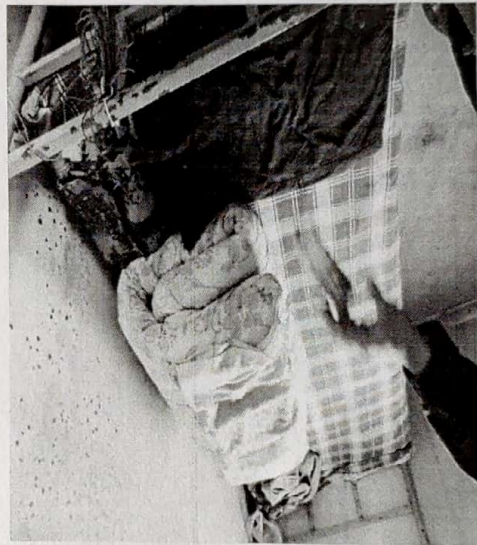

常州正衡电力工程监理有限公司项目部

检查人:

赵焕松

2019.6.4



由 扫描全能王 扫描创建
