

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 07 日

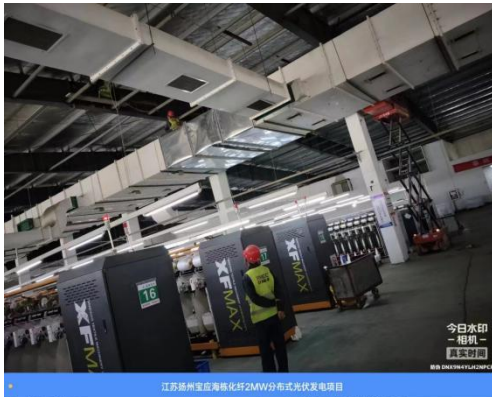
天气：晴

工程名称:江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目

气温：5~17℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行屋面加固、交直流桥架安装，直流电缆敷设，运维通道支架安装，运维通道安装。	
	进度情况：常规坊车间厂房加固，常规坊车间屋面直流电流敷设，常规坊车间屋面运维通道支架安装，运维通道安装；成品库车间屋面运维通道支架安装，运维通道安装，成品库车间屋面桥架安装。	
	材料进场情况：支架到货 1.92MW	总量 1.92MW
	逆变器到货 32 台	总量 32 台
	中压、边压块到货 1.92MW	总量 1.92MW
	检修通道到货两个屋面	总计 2 个屋面
施 工 情 况	桥架到货两个屋面	总计 2 个屋面
	直流线到货 10000 米	总计约 20000 米
	安全情况：施工现场施工人员劳保用品佩戴齐全，工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	江苏日晖能源工程有限公司	1、常规坊车间厂房加固、屋面直流电流敷设，运维通道支架安装。 2、成品库车间屋面桥架安装、屋面运维通道支架安装、屋面运维通道安装。
其 它 事 项	施工资料未报审。	
记录人:邱华		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/04/07
施工单位	江苏日晖能源工程有限公司	施工负责人	李立建
现场照片	 今日水印相机 真实时间 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2023.04.07 09:52 天气: 晴 11℃ 地点: 宝应县·宝应时代包装材料有限公司	 今日水印相机 真实时间 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 厂房加固 拍摄时间: 2023.04.07 10:13 天气: 晴 13℃ 地点: 宝应县·江苏裕鑫车业科技有限公司	
描述	桥架安装	厂房加固	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 运维通道支架安装 拍摄时间: 2023.04.07 10:32 天气: 晴 13℃ 地点: 宝应县·宝应电气	 今日水印相机 真实时间 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 直流电缆敷设 拍摄时间: 2023.04.07 16:23 天气: 晴 17℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司	
描述	运维通道支架安装	直流电缆敷设	
