

安全旁站监理记录


工程名称：普洛斯济南临港西区物流园 800KW 分布式光伏发电项目 编号 ZHJL-JNLG-001

现场工作内容		组件材料垂直运输	
作业地点		B-2 库房	
作业项目主要危险分析		起吊材料，每次约 500Kg；吊车为 25 t 起吊器具检查，安全防护用品到位。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	分包负责人到位，配安全员一人，辅助工 3 人，佩戴安全帽，设置警示带	
	平面布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。	
	安全措施	屋面材料及时分散，能满足；	
现场主要问题	无		经检查起吊方法，人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有证件。 复验意见：无
	整改结果：无		
旁站时间	开始	2020 年 6 月 22 日 7 时 00 分	对应作业
	结束	2020 年 6 月 22 日 10 时 30 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：黎建光

作业负责人（签名）：张建

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
 2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

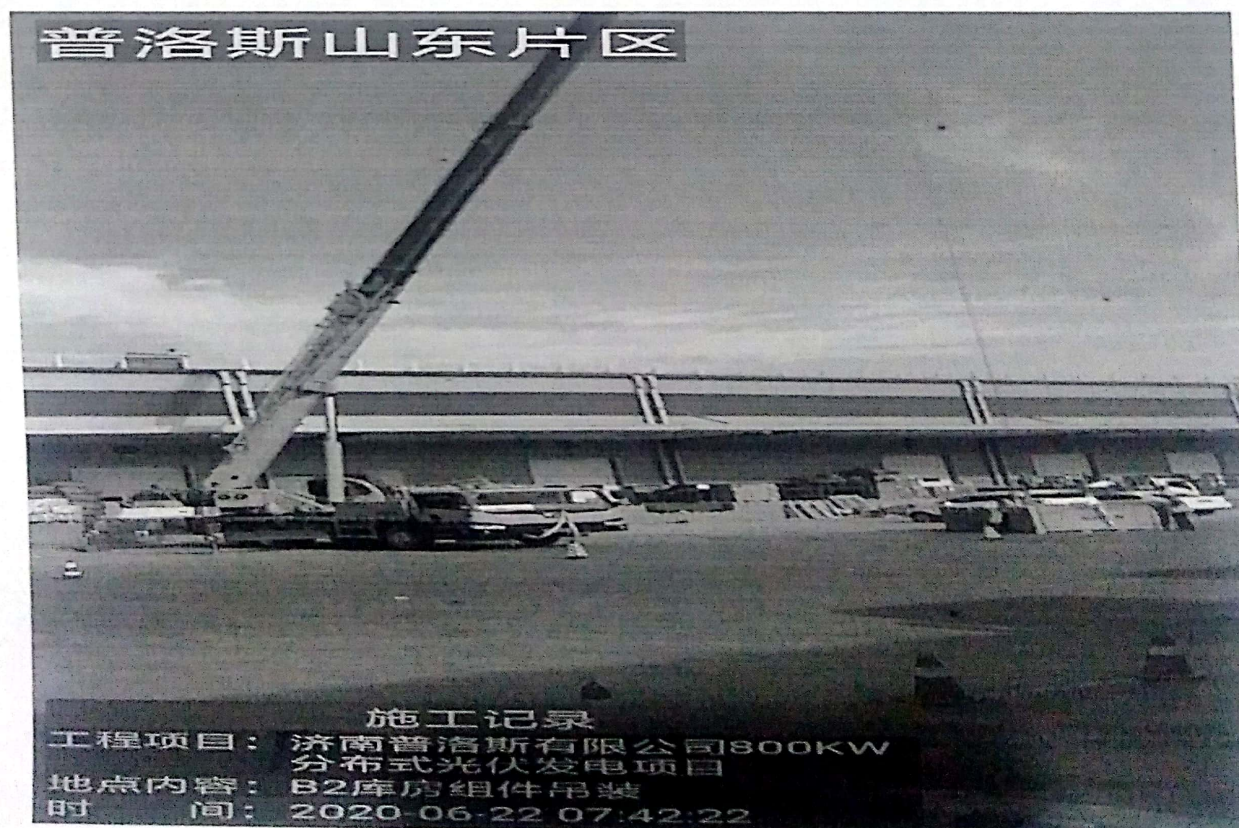

施工记录	
工程项目:	济南普洛斯有限公司800KW
	分布式光伏发电项目
地点内容:	B2库房组件吊装
时 间:	2020-06-22 07:42:22
