

监理工程师通知单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-TZD-016

致：包头青山电气设备有限公司施工项目部

主题：

关于综合用房屋面施工、施工日报事宜。

内容：

1、现你单位施工的综合用房屋面保温板未曾报验，无产品合格证和质量检测报告，找坡层用矿渣与设计要求的 LC5.0 轻集料混凝土找坡层不符，望你单位立即按照设计要求进行整改，并将整改结果于 2018 年 6 月 25 日前报回我方，否则由此引起的安全、质量等一切问题所造成的损失由你单位自行承担。

2、现场每天不上传施工日报，现要求施工单位必须每天上传施工日报，如不上传将下发监理罚款单。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：2018.6.23



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：016

致：常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目监理部：

我方接到编号为 016 的监理工程师通知后，已按要求完成了 通知 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、检验报告见附图、合格证。
- 2、找坡层已按设计图纸组织施工。
- 3、施工日报已上传。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

2018.6.23

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018.6.25

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建

YHZ/BN01



173001060139



检测报告

TEST REPORT

报告编号: YHZ18N010136

工程名称 ----
Name of Engineering

委托单位 贺兰县华强阳光保温材料有限公司
Client

产品名称 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
Product Name

委托检测 委托检测
Type of Test

报告日期 2018年05月29日
Date of Report



银川衡正信诚检测有限公司

YinChuan HengZhengXinCheng Testing Co., Ltd.

公司地址: 宁夏银川兴庆区兴春路376号4号生产车间

联系电话: 0951-8989250

邮编: 750001



由 扫描全能王 扫描创建

银川衡正信诚检测有限公司

YinChuan HengZhengXinCheng Testing Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

报告编号: YHZ18N010136

第1页 共3页

工程名称	----	样品编号	18N010136
委托单位	贺兰县华强阳光保温材料有限公司	委托日期	2018年05月22日
施工单位	----	检测日期	2018年05月23日
建设单位	----	样品状态	符合检测要求
监理单位	----	样品数量	15块
产品名称	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	代表数量	----
生产单位	贺兰县华强阳光保温材料有限公司	规格型号	1200×600×100
使用部位	----	取样人及证号	冯存敏
检测项目	压缩强度、导热系数、燃烧性能	见证人及证号	----
检测依据	《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2-2002 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012		
检测结论	经检测, 所检样品必试项目中压缩强度、导热系数符合GB/T 10801.2-2002中X250类技术要求的规定, 燃烧性能符合GB8624-2012中B₁(C-s2, d0)级技术要求的规定。 银川衡正信诚检测有限公司 报告日期: 2018年05月29日		
备注	燃烧性能试验是在特定的试验条件下, 试验结果与试样的性能有关, 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。		

批准:

马文兰

审核:

曹超

检测:

唐玲



银川衡正信诚检测有限公司

YinChuan HengZhengXinCheng Testing Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

报告编号: YHZ18N010136

第2页 共3页

序号	检测项目		单位	技术指标	检测结果	单项 评定
1	压缩强度 (相对形变10%)		kPa	≥ 250	330	符合
2	导热系数 (平均温度25℃)		W/ (m·K)	≤ 0.030	0.030	符合
3	燃烧性能	可燃性	mm	60s内焰尖高度Fs ≤ 150 mm	Fs<150	符合C级
			—	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	60s内无引燃滤纸现象	
		氧指数	%	≥ 30	30.7	
		单体燃烧	W/s	FIGRA _{0.4MJ} ≤ 250	220.76	
			m	LFS<试样边缘	LFS<试样边缘	
			MJ	THR _{600s} ≤ 15	11.57	
			m ² /s ²	SMOGRA ≤ 180	30.22	
			m ²	TSP _{600s} ≤ 200	135.25	
			s	600s内无燃烧滴落物/微粒	无滴落物、微粒	符合d0
备注		1. FIGRA _{0.4MJ} —当试样燃烧释放热量达到0.4MJ时的燃烧增长速率指数 2. LFS—火焰横向蔓延 3. THR _{600s} —燃烧时间为600s的总热释放量 4. SMOGRA—烟气生成速率指数 5. TSP _{600s} —燃烧时间为600s的总烟气产生量 6. Fs—燃烧长度				

审核:

曹超

主检:

唐玲



由 扫描全能王 扫描创建

银川衡正信诚检测有限公司

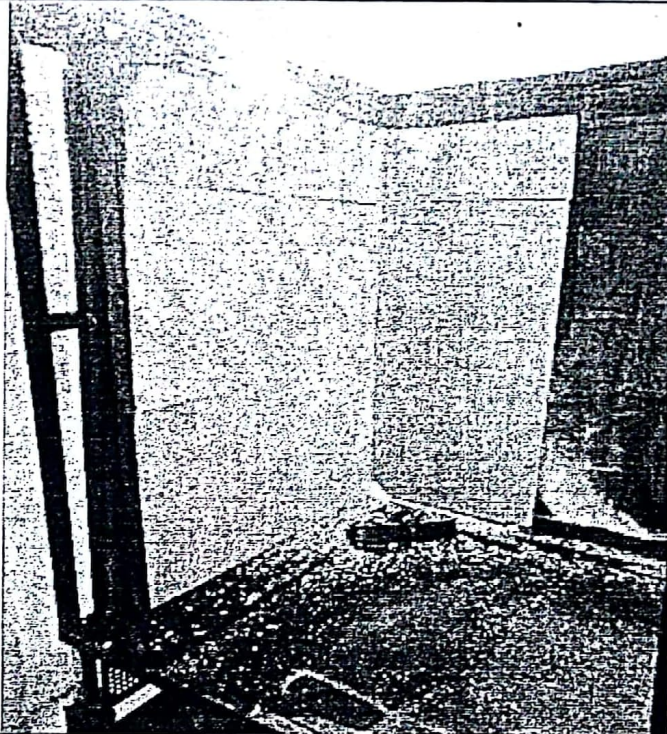
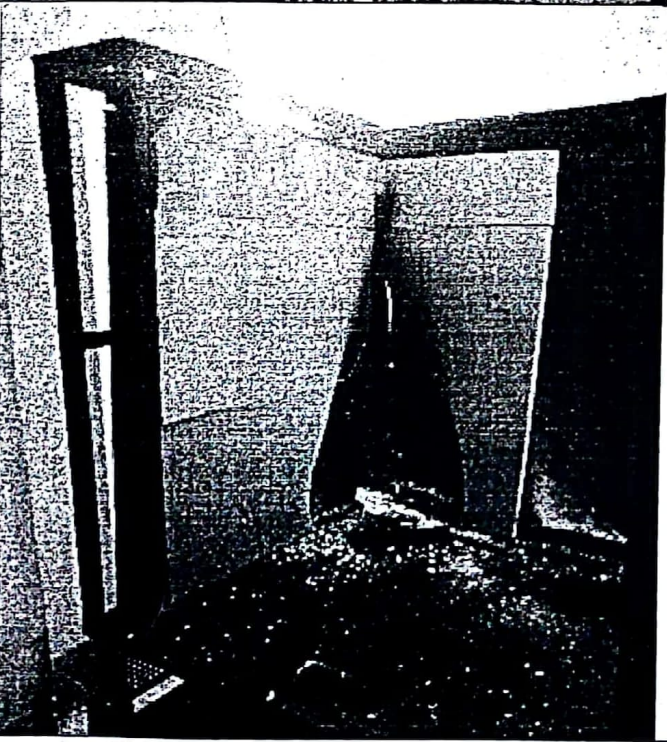
YinChuan HengZhengXinCheng Testing Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

报告编号: YHZ18N010136

第3页 共3页

试 验 前	
试 验 后	

审核: 曹超

主检: 唐玲



由 扫描全能王 扫描创建

产品质量出厂检验合格证

合格证

证书编号：银质监字（2018）06号

企业名称：贺兰县华强阳光保温材料有限公司

产品名称：绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

规格：1200mm X 600mm X 100mm

密度： ≥ 25.0

导热系数： ≤ 0.030

压缩强度： ≥ 200

检验依据：GB/T1080L 2-2002

检验报告：NO: 11013420

检验日期：2018年5月3日

生产日期：2018年5月25日



贺兰县华强阳光保温材料有限公司

2018年5月3日



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-TZD-017

致：包头青山电气设备有限公司施工项目部


主题：

关于集电线路电缆直埋事宜。

内容：

光伏区及光伏区到开关站的 35KV 集电线路电缆及通讯光缆的直埋两者平行或交叉时净距大于 50CM，过路均需穿钢管保护。直埋电缆需要铺沙盖砖或盖瓦，回填后每隔 50M 及电缆转角点设置电缆标示桩。望你单位尽快组织材料进场并按图施工，否则由此引起的质量及安全问题所造成的损失由你单位自行承担。

项目监理机构（章）：



专业监理工程师：

王明官

日

期：

2018.6.27

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: 017

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目 监理部:

我方接到编号为 017 的监理工程师通知后。以严格按照设计 整改 完成, 请予以审查。

详细内容:

见附图

施工项目部 (章):

项目经理: 张瑞

日

期: 2018.6.25

监理项目部复查意见:

严格按照图纸规范要求施工

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 王成

日

期: 2018.6.25

注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建

