

经济考核单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-FK-032

主送：安徽天太太阳能工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于进度滞后事宜

内容：

根据施工合同进度要求，以及多次例会中建设单位要求 2020 年 5 月 15 日前完成所有工程量，若滞后每天进行经济考核 10000 元（大写：壹万圆整），现工期已滞后 49 天，未按要求节点完工，现按建设单位要求每周进行一次经济考核，本次考核为第七周考核，考核 70000 元整（大写：柒万圆整）。

望加快进度，早日完工。

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：




监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

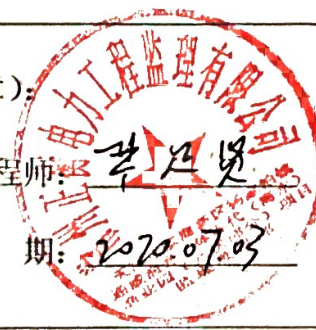

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。
