

工程罚款单

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目



编号: ZHJL-FKD-05

被罚单位	芜湖和诚电力工程有限公司
被罚项目	溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目
被罚金额 (大写)	伍 仟 元 整
罚款原因: 1、屋顶施工人员擅自拆除 LY3 4 号平台吊装口围栏, 并经此处上屋顶, 严重违反厂区的安全要求, (且此处是厂区机房业主方是不允许随意进入, 如进入, 需到物业办公室登记再进入)。此事件严重影响公司的安全施工形象。同时也反映出总包方对安全生产的意识薄弱。 2、自 9 月 24 日破路 (电缆沟开挖) 开始后业主项目部、监理项目部管理人员每天在巡视施工现场期间, 周例会期间, 多次对施工现场负责人要求: ①破路后建筑垃圾及时装袋并当天清理, 保持施工现场整洁。 ②破路后及时用钢板盖好, 保证车辆人员通行。 ③破路后需要做好防护围挡的部分, 保证安全围挡防护到位。 截止到 9 月 29 日 18 时破路后的建筑垃圾未清理, 破路后的钢盖板未到位, 造成破路的主路仍未通车。 特针对以上事件对总包方 (芜湖和诚电力工程有限公司) 考核 5000 元。 同时希望总包方在今后的施工过程中扣紧安全生产的弦并同时保证施工质量和施工形象。	
项目监理部意见: 项目监理部 (章):  总监理工程师: <u>修智明</u> 日 期: <u>2020年09月29日</u>	
建设管理单位意见: <u>同意, 注意类似事件, 再有发生重罚。</u> 建设管理单位 (章):  项目经理: <u>赖东平</u> 日 期: <u>2020.09.29</u>	



本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存一份。




扫描全能王 创建

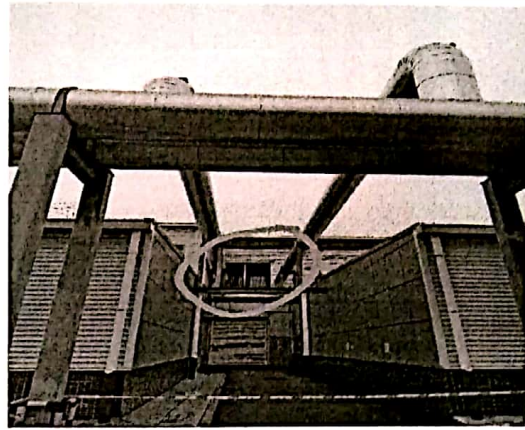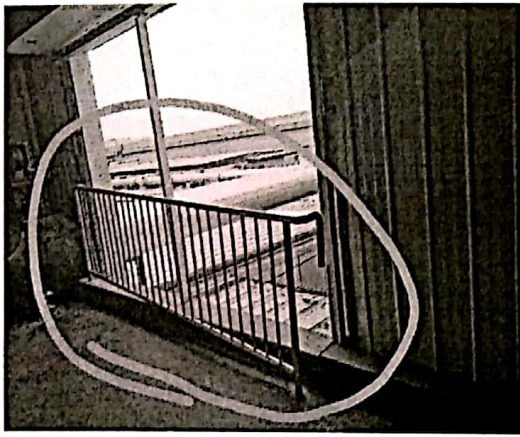

LY3 4 号平台的具体位置

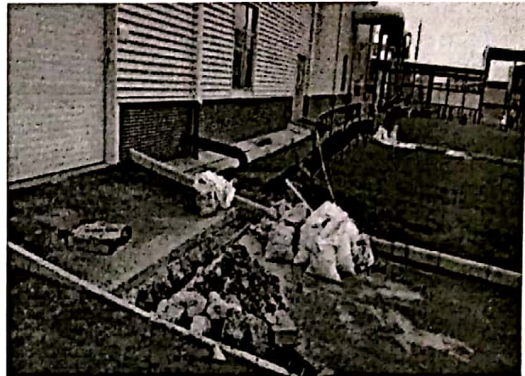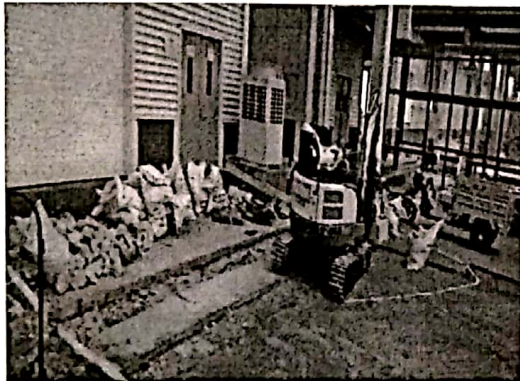

破路现场建筑垃圾未清理

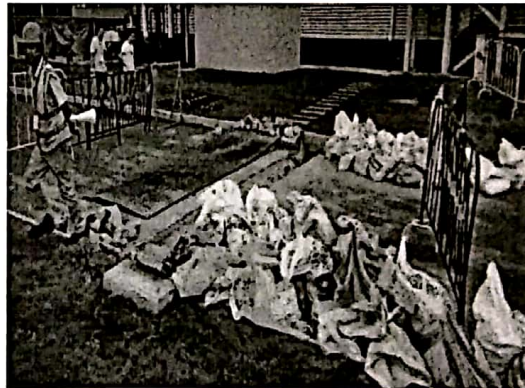

主路破路后垃圾未清理，钢盖板未盖到位，造成主路一直未通车。

