



编号：JXM15-XXAK-01

监 理 月 报

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材
2.6MW 分布式光伏发电项目

2020 年 6 月

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2020 年 06 月 30 日

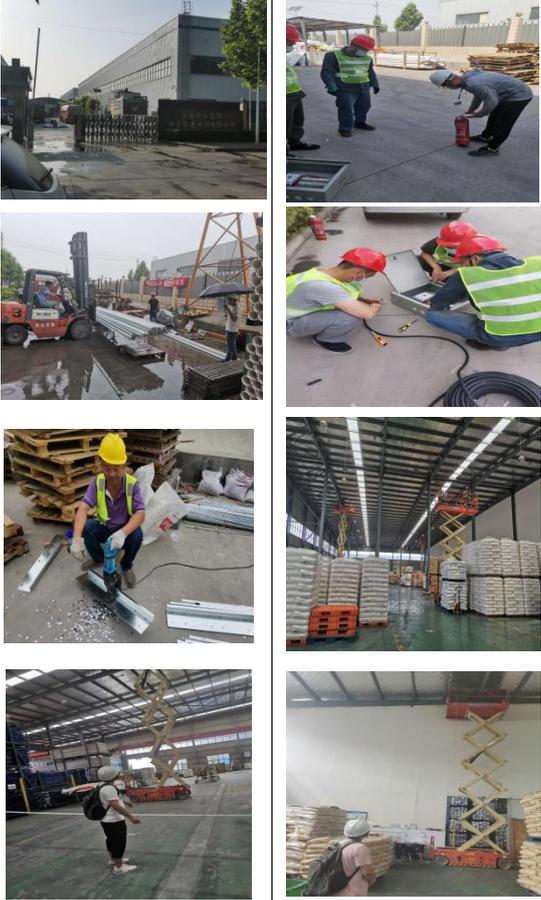
监 理 月 报

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目月次 第 1 次

月报开始时间 2020 年 06 月 1 日 结束日期 2020 年 06 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目		照片	8	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	4号厂房加固工程	4号厂房加固工作。	5号厂房加固工作，4号厂房屋面放线及夹具安装。
	设备交付进度	无	/
	设计交付进度	厂房图纸完成	厂房图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	完成施工图会审	
	设计交底	设计已交底	
	方案审查	安装单位未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	已交底	
	设计变更	无	
	安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训
安全交底情况		对即将开始施工的夹具、导轨、格栅板安装，工器具使用、吊装安全文明施工注意事项进行监督。	持续监督检查
安全措施落实情况		施工工器具暂未进场不涉及安全问题。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
安全文明施工情况		巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	核对图纸，检查夹具放线定点安	检查夹具放线定点安装情况。安

		装情况。并做拉拔力测试。	排做拉拔力测试。
	主要原材料质量	夹具、桥架、扁铁、镀锌圆管等	/
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

- 1、4号厂房加固全部完成，并进行分项分部验收。
- 2、5号厂房加固完成40%。
- 3、4号厂房屋面定点放线。

三、 下月进度计划

- 1、5号厂房加固工作完成，并进行验收。
- 2、3号厂房进行加固。
3. 4号厂房屋面定点放线，并进行夹具安装。
4. 安装材料进场。

安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		13人	/	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特种工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特种工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
2020 年 06 月 30 日
