

衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

工程 监 理 周 报

(2020 年 6 月 15 日 至 2020 年 6 月 21 日)

编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司

江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理部



2020 年 6 月 21 日

一、参建单位信息

建设单位：衡南煜盟新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中广达能源电力工程设计有限公司（光伏区）

衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司（外线）

施工单位：湖南中程电力工程有限公司

二、本周完成工作量

光伏区和开关站：因征地问题和村民阻工原因暂未施工。

外线：1#塔基基坑挖掘整改施工，基坑抽排水。

三、下周计划完成工作量

光伏区、开关站因征地款（村民阻工）原因，暂无计划。

外线：1#塔基基坑挖掘整改施工完成，7#塔基混凝土浇筑完成。

四、存在问题


本周因征地款、外线进度款问题迟迟未解决等原因影响，本周施工进度缓慢，

已督促相关单位抓紧协调，抓紧采取有效措施，加快施工的进度。


五、工程影像资料



1#塔基基础挖掘整改施工

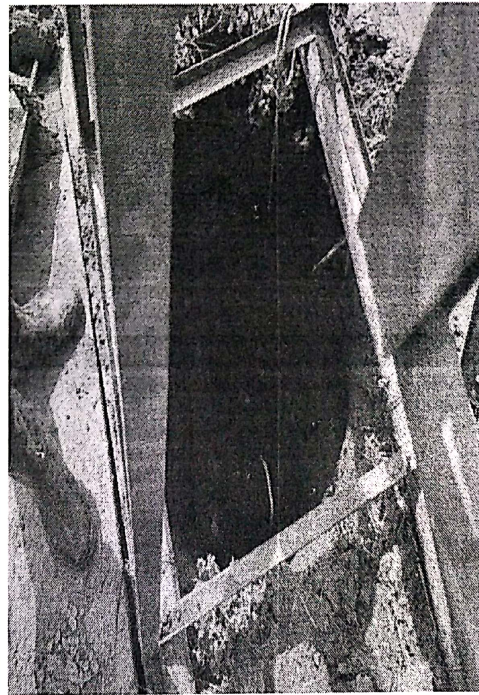

1#塔基基础挖掘整改施工

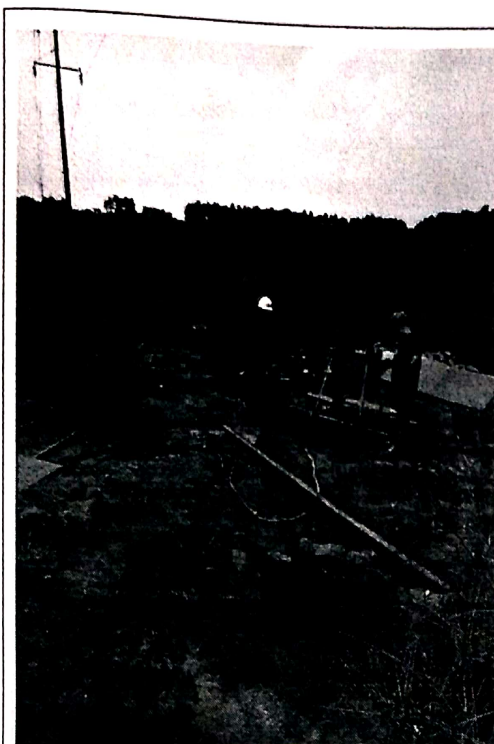

监理人员巡视检查



监理人员巡视检查
