

衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

工程 监 理 周 报

(2020 年 5 月 25 日 至 2020 年 5 月 31 日)

编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司

江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理部

2020 年 5 月 31 日



一、参建单位信息

建设单位：衡南煜盟新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中广达能源电力工程设计有限公司（光伏区）

衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司（外线）

施工单位：湖南中程电力工程有限公司

二、本周完成工作量

光伏区和开关站：因征地问题和村民阻工原因暂未施工。

外线：1#塔基基础土方开挖整改施工（因图纸更改），1#塔基基础钢筋笼焊接，5#塔基混凝土部分拆模、基坑抽排水。

三、下周计划完成工作量

光伏区、开关站因资金和征地（村民阻工）原因，暂无计划。

外线：7#塔基混凝土浇筑完成。

四、存在问题

因征地协调和村民阻工原因，光伏区和开关站暂停施工，已督促相关单位抓紧协调；因资金问题迟迟未解决，外线施工进度缓慢，已督促相关单位抓紧采取有效措施，加快施工进度。

五、工程影像资料




5#塔基基坑抽排水



5#塔基基础拆模



监理人员巡视检查

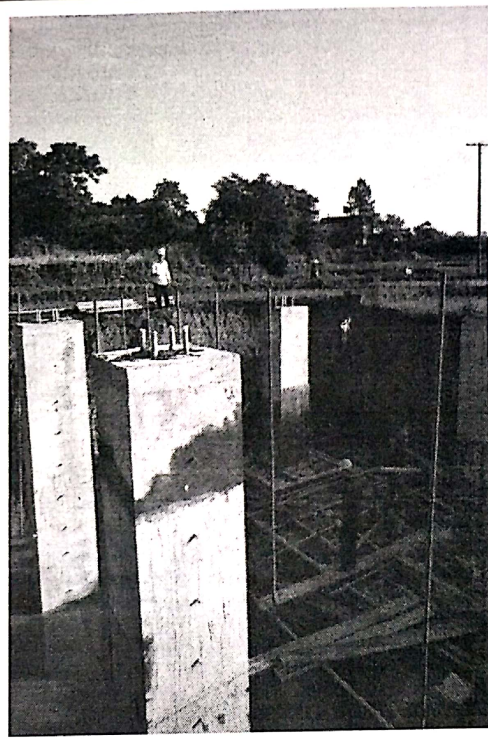

监理人员巡视检查
