

新沂户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 6 周

项目名称:徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目	填报周期: 2023 年 8 月 5 日 - 8 月 11 日
---	---------------------------------



项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	3
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	3	8	4	4	4	3

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	新沂上电申宏新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	获客开发人员	78
		工程管理人员	3
		现场施工工人	30
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2

二、本周获客情况

本月计划获客（620）户。本周实际获客（63）户，其中，平屋面（63）户，斜屋面（0）户，预计可安装容量（1.8）MW。项目累计获客（465）户，其中（110）户已开始或完成建设，（171）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（184）户。

下周计划获客（200）户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(1.46)吨，累计到货(139.46)吨。

2.本周组件到货(0.43)MW，累计到货(4.022)MW，达到总量的(1.609)%。

3.本周逆变器到货(5)台，累计到货(226)台，达到总量的（2.125）%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？是/否

否

四、勘探情况

本周共计勘测 48 户，勘测块数 2124 块，勘测容量 1.211MW，其中客户反悔有 1 户。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0.8）MWp。本周实际安装组件 17 户，容量（0.415）MWp，累计已安装组件 110 户，容量(2.969)MWp，完成总量的（1.19）%。本周实际安装电器 29 户，容量(0.87)MWp，累计已安装电器 85 户，容量(2.395)MWp，完成总量的（0.96）%。

下周计划安装（0.8）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（50）户并网审核资料。本周计划向电网递交（21）户并网审核资料，实际递交（21）户并网审核资料。累计递交（29）户，下周计划向电网递交（10）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（2）块，下周需求（10）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？是/否

是

本周并网(0.057)MWp，本月累计并网(0.137)MWp，项目共并网(0.137)MWp,完成总量的（0.055）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需

哪个层面提供何种支持)

1、竞争激烈我公司业务费比同行低，业务员频繁跳槽

目前已经签订 3 个乡镇的开发协议，开发工作陆续推进，加大业务员的人数。

2、农户临时反悔，施工进度缓慢

加强施工队与农户的沟通能力，与业务员共同协调解决，增加施工人员

3、中午气温偏高，安装速度减缓

合理计划施工时段

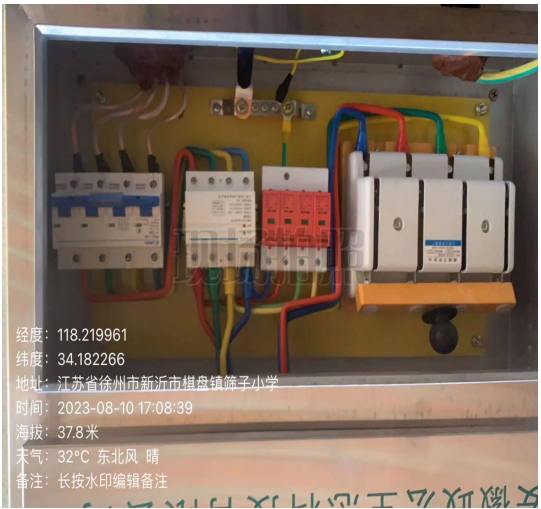
4、并网人员不足，整理资料不能及时。

增加并网人员

填报人张望; 审核人: 张俊; 时间: 2023 年 8 月 11 日

工程现场照片: (安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张)

支架安装	组件安装
	
组件回路电压测试	逆变器安装
	

施工站班会  07:53 2023-08-10 星期四 徐州市·小章家	防水处理  18:37 2023-08-09 星期三 晴 33°C 新沂市·孙家巷
组件接线  现场拍照 经纬度: 118.220039 经度: 34.18226 地址: 江苏省徐州市新沂市棋盘镇筛子小学 时间: 2023-08-10 16:42:11 海拔: 27.0米 天气: 32°C 东北风 晴 备注: 长按水印编辑备注	接地电阻测试  经纬度: 118.219959 经度: 34.182351 地址: 江苏省徐州市新沂市棋盘镇筛子小学 时间: 2023-08-10 17:34:38 海拔: 37.8米 天气: 32°C 东北风 晴 备注: 长按水印编辑备注
接地焊接  时间: 2023-08-09 13:46 天气: 阴 31°C 地点: 新沂市·棋盘镇 海拔: 29.5米 方位角: 西北296 速度: 0.0公里/小时 经纬度: 34.420943°N, 118.610430°E	配电箱安装  经纬度: 118.219961 经度: 34.182266 地址: 江苏省徐州市新沂市棋盘镇筛子小学 时间: 2023-08-10 17:08:39 海拔: 37.8米 天气: 32°C 东北风 晴 备注: 长按水印编辑备注
