

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2022 年 04 月 20 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	100 天		
当年任务	并网发电。		
当年完成比例	100%		
当前比例	90%		
本周下雨天数	1	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
1、工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、3#和 20#楼屋顶完成组件安装工序的施工。 2、6#、7#、10#、11#、13#、14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、22#、23、24#、25#、26#、30#、31#和 34#楼共 20 栋完成下引桥架的安装施工。 3、箱变至开关站，开关站和 SVG 设备高压电缆敷设完成，终端制作进行中。 4、箱变、开关站和 SVG 设备等二次接线进行中。 5、电缆沟穿管敷设完成，土质回填完成，破路处完成沥青石子恢复。		
2、投资情况	本周没有新进场材料和设备，产值约 0 万元，施工劳务约 15 万元。累计完成约 2097.50 万元，约占总合同价的 96.35%(按合同价 2177.1487 万元计算)。		
3、下步计划	下周计划（4 月 23 日-4 月 29 日）： 1、完成所有屋顶的逆变器安装、接线和组串测试。 2、完成所有屋顶接地焊接、桥架敷设和光伏线缆敷设。 3、完成所有屋顶下引桥架安装，低压线缆敷设及终端制作连接。		

	4、完成箱变、开关站和 SVG 等设备的二次接线，调试完成。 5、高压线缆耐压试验完成，所有调试完成。 6、进行预验收，初步达到并网验收要求。 7、尾项工作进行完善（如施工现场卫生、绿化恢复及安全防护围栏安装等）
4、周工作小结	现场对新冠疫情防控常态化强化了严格管理，配合新区和园区的各项防疫管理要求，每日报备入园施工人员的两码和核酸检测结果，要求施工人员进行核酸检测阴性证明后方可入园施工。召开例会与施工单位沟通细化并网前各项工作进度计划，落实人员和机械完成安装以及各项调试试验工作的加快进行。
5、需要协调问题	已协调施工单位抓紧落实施工进度。落实安装检测事宜。

6、目前进度：

目前进度：1、所有 30 栋楼均完成组件安装；完成 15 栋楼已接地焊接、桥架敷设和光伏线缆敷设工作；完成 20 栋楼下引桥架安装；

2、土建施工已全部完成，破路修复已完成；

3、园区 5#和 8#配电房内并网柜已完成拼柜（母线连接）；

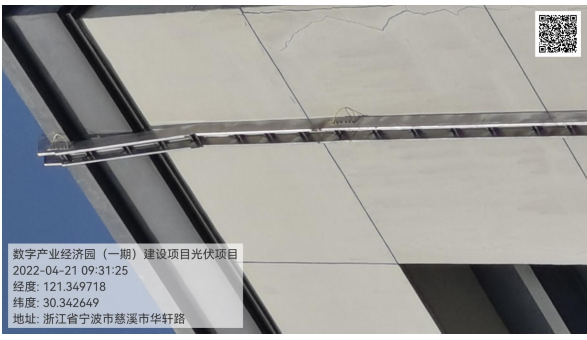
4、箱变、升压站和 SVG 设备均已安装就位，高压线缆敷设到位；二次线接线完成 50%；

5、目前高低压电缆到货已材料送检，组件现场安装检和部分系统测试即将进行。

投资情况：本周完成材料设备产值 0 万元；施工劳务约 15 万元。累计完成约 2097.50 万元，占总合同价的 96.35%(按合同价 2177.1487 万元计算)。

下步计划：4 月 30 日前争取完成所有施工工作量；积极收集齐全所有送检材料检测报告；箱变、升压站和 SVG 等设备并网前完成试调事宜；完成组件现场安装检和部分系统测试事宜；加强安全文明施工及强化疫情防控措施。

附现场照片：

文字描述	下引桥架安装		下引桥架安装成品	
图片	 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-22 13:48:54 经度: 121.349417 纬度: 30.342124 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路		 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-21 09:31:25 经度: 121.349718 纬度: 30.342649 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路	
文字描述	低压电缆敷设		通讯线缆敷设	
图片	 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-22 13:40:26 经度: 121.348654 纬度: 30.34417 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海九路		 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-22 13:40:09 经度: 121.348601 纬度: 30.344094 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海九路	
文字描述	二次接线中		通信接线中	
图片	 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-18 12:38:44 经度: 121.350417 纬度: 30.342386 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路		 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-19 14:02:11 经度: 121.349913 纬度: 30.342438 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路	
文字描述	箱变至开关站高压线缆敷设		开关站至配电房高压线缆敷设	
图片	 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-21 09:24:20 经度: 121.348538 纬度: 30.343946 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海九路		 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-16 14:52:20 经度: 121.348949 纬度: 30.343037 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路	

