

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2024 年 04 月 19 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	100% 55%		
本周下雨天数	2 天	实际可施工天数	5 天
工程推进情况			
工程进度	<p>形象进度：</p> <p>本周完成情况：</p> <ol style="list-style-type: none">B2#楼屋顶支架材料和组件安装基本完成。B2#楼屋顶接地材料（扁钢）摆放完成 50%，开始制作。桥架安装孔开始打孔，完成约 50%。接地扁钢到货 100%，清洗系统水管到货 100%，穿线软管到货 100%。		
投资情况	本周接地扁钢、清洗系统水管和穿线软管到货 100%，材料产值约 3 万元；施工劳务约 2.5 万元；合计完成约 169.70 万元，约占总合同价的约 62.0%(按合同价 273.81 万元计算)。		
下步计划	<p>下周计划：</p> <ol style="list-style-type: none">B2#楼屋顶组件安装完成 100%，B1#和 B2#楼开始光伏汇线。B2#楼屋顶接地安装完成约 50%；B1#桥架安装完成约 50%。施工过程资料同步提交审核报验。		
周工作小结	进入现场施工积极做好雨季施工现场用电和其他安全文明施工的教育宣贯，在雨季期间加强了用电和其他安全防范措施。B1#和 B2#屋顶安装等正常施工。		
需要协调问题	<ol style="list-style-type: none">已落实图纸会审及相关事宜。请建设单位抓紧确认接入方案，并网手续开始办理的时间。		

目前进度：

- 1、B2#楼屋顶支架材料和组件安装基本完成。
- 2、B2#楼屋顶接地材料（扁钢）摆放完成 50%，开始制作。
- 3、桥架安装孔开始打孔，完成约 50%。
- 4、接地扁钢到货 100%，清洗系统水管到货 100%，穿线软管到货 100%。

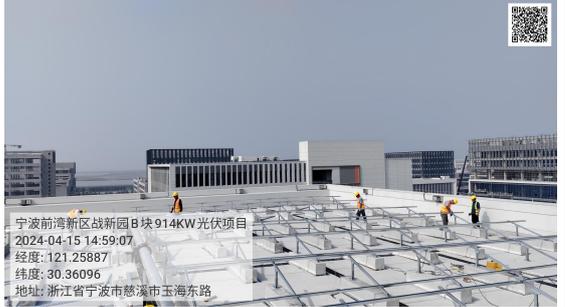
投资情况：

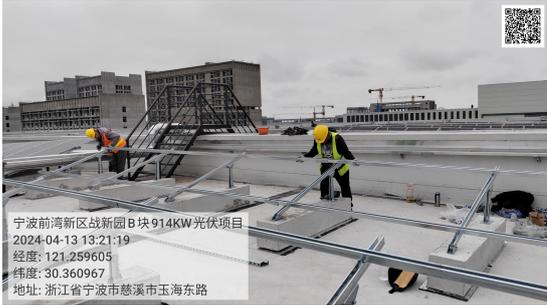
本周接地扁钢、清洗系统水管和穿线软管到货 100%，材料产值约 3 万元；施工劳务约 2.5 万元；合计完成约 169.70 万元，占总合同价的约 62.0%(按合同价 273.81 万元计算)。

下一步计划：

- 1、B2#楼屋顶组件安装完成 100%，B1#和 B2#楼开始光伏汇线。
- 2、B2#楼屋顶接地安装完成约 50%；
- 3、B1#桥架安装完成约 50%。
- 4、施工过程资料同步提交审核报验。

附现场照片：

文字描述	监理对 B2#楼支架安装角度进行检查	B2#楼屋顶西北方块支架安装
照片	 <p>宁波前湾新区战新园 B 块 914KW 光伏项目 2024-04-15 15:03:41 经度: 121.258971 纬度: 30.361174 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>	 <p>宁波前湾新区战新园 B 块 914KW 光伏项目 2024-04-15 14:59:07 经度: 121.25887 纬度: 30.36096 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>
文字描述	B2#楼支架连接件进行焊接	B2#楼组件进行安装
照片	 <p>宁波前湾新区战新园 B 块 914KW 光伏项目 2024-04-18 10:19:47 经度: 121.258849 纬度: 30.360628 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>	 <p>宁波前湾新区战新园 B 块 914KW 光伏项目 2024-04-16 10:10:29 经度: 121.258801 纬度: 30.361073 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>

文字描述	B2#楼条形基础进行就位	B2#楼支架檩条进行安装
照片	 <p>宁波前湾新区战新园B块914KW光伏项目 2024-04-13 13:27:34 经度: 121.258984 纬度: 30.361013 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>	 <p>宁波前湾新区战新园B块914KW光伏项目 2024-04-13 13:21:19 经度: 121.259605 纬度: 30.360967 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>
文字描述	桥架安装前进行打孔	本周召开例会
照片	 <p>宁波前湾新区战新园B块914KW光伏项目 2024-04-17 15:59:45 经度: 121.273701 纬度: 30.360607 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>	 <p>宁波前湾新区战新园B块914KW光伏项目 2024-04-16 14:55:58 经度: 121.259605 纬度: 30.360967 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>
