

监理工作联系单

工程名称 新疆伊犁矽美仕 100mwp(一期 20mwp)光伏发电项目

编号: JL-XMS-01

致: 泰州金太阳光伏有限公司项目部:

主题: 主题: 项目安全、文明施工

内容: 安全是保证施工正常进行的一个重大前提, 对于现场的安全管理尤为重要。

1. 现场必须配备专门的安全员, 对现场进行不间断的检查。
2. 现场安全施工资料必须真实、准确的填写, 包括现场巡检记录、应急预案、用电、用火检查等。
3. 现场必须配备专门的安全灭火设施, 包括灭火器、消防斧、灭火沙等。
4. 涉及到用电方面的技术, 必须由专门电工施工, 并且须具备电工证。
5. 配电箱、电焊机、切割机等大型机械作业, 必须具有可靠的接地。
6. 由于项目现场施工环境的特殊性, 严禁货车载人现象出现。
7. 为了保证施工作业面的整齐、干净, 所有材料进场、安装必须实现“料尽、厂清”。组件安装完剩余的纸箱、组件保护角片, 当天下班必须清理完成。
8. 严禁各施工人员随意摘取周围的农民水果, 一经发现从严处理。
9. 进入现场人员必须配备安全帽。
10. 吊装时候施工队必须严格遵循“十不吊”原则。

附件: 照片

抄送: 业主

项目监理机构 (章):



总监理工程师:

日

期:



现场照片

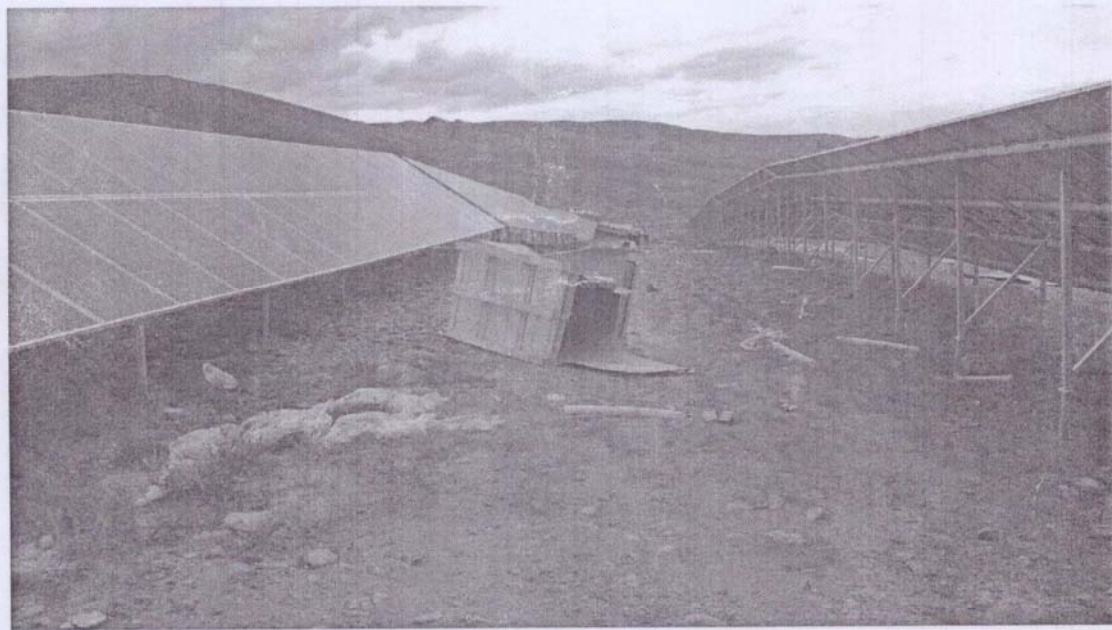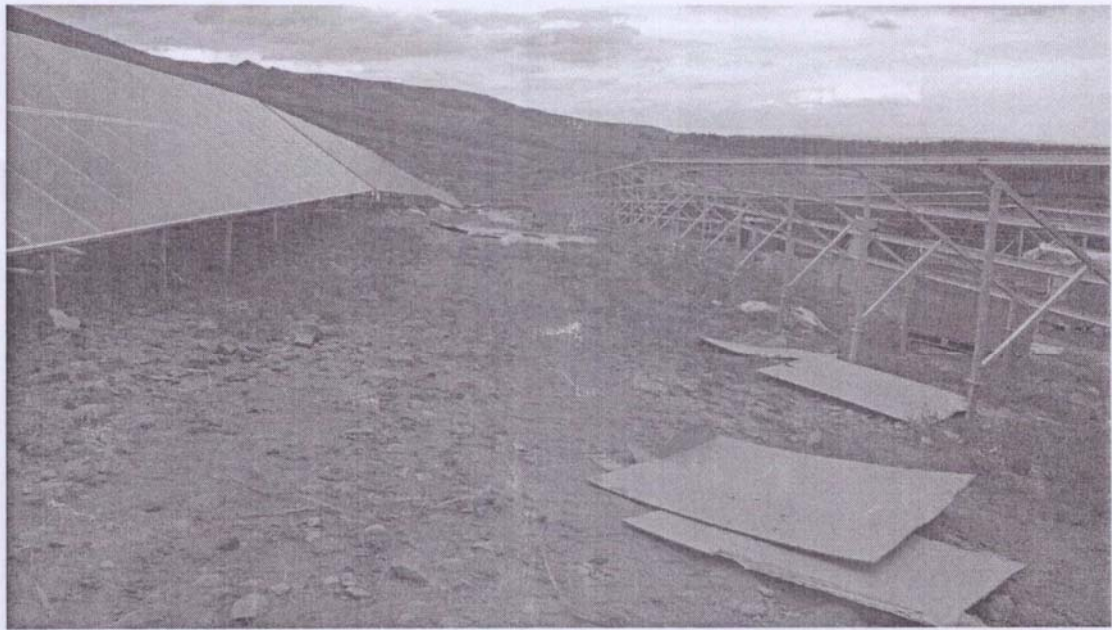

现场垃圾必须当天下班之前清理完成

有限公司
监理部
(1)
