

监 理 联 系 单

工程名称：沭阳国凯新能源 10.1556MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：

ZHJL-LXD-002

致：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：你单位承包施工的《沭阳国凯新能源有限公司 10.1556MW 屋顶分布式光伏发电项目》：监理在现场发现以下问题：

1：凯能 9#屋面彩钢瓦瓦型与施工采用的夹具不匹配，导致夹具安装后无法达到设计要求，现要求你方确定整改方案，抓紧时间整改，整改方案确定后报我方审核：

监理项目部：（章）


总/专业监理工程师： 

日期：2024年9月26日

T型螺母脱落



夹具与瓦型不匹配

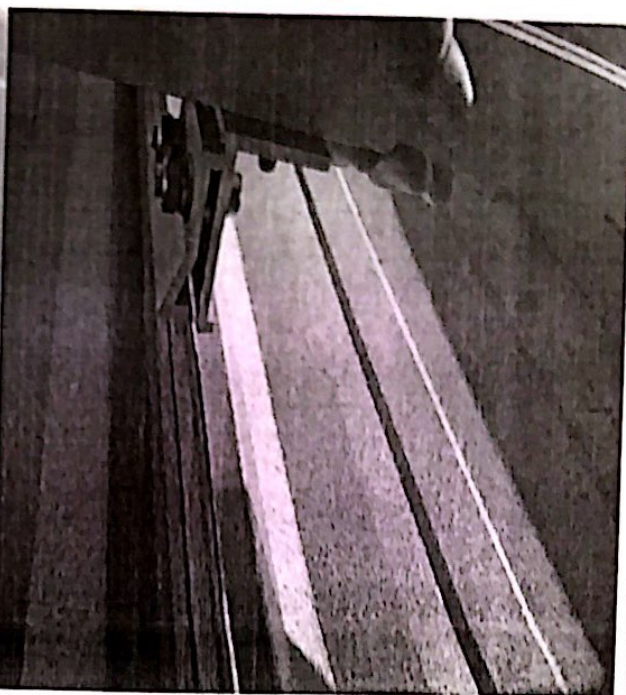

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。
