

监理工作联系单

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-LX-001

致：宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

主题：关于做好高温季节和强降雨期间施工安全相关事宜

内容：现已进入盛夏高温季节，又值施工高峰期，高温天气极易对施工安全造成影响，为做好高温酷暑期间和强降雨期间的安全施工工作，预防安全生产事故发生，确保施工人员的身心健康。现要求施工单位做好以下防范措施：

- 1、应合理安排作息时间，要采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止工人中暑。
- 2、日气温达到 40℃ 以上，应当停止当日室外露天作业；日最高气温达到 37℃ 以上 40℃ 以下时，施工单位全天安排工人室外露天作业时间累计不得超过 6 小时，连续作业时间不得超过国家规定时间，且在温度最高时段 3 小时内不得安排室外露天作业；日最高气温达到 35℃ 以上 37℃ 以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短工人连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。
- 3、加强对施工人员的关怀，防止施工过程中因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故，定期为施工一线人员发放防暑降温物品。
- 4、加强现场施工人员防暑降温知识的宣传教育、预防中暑和冷却知识及中暑急救知识，提高一线施工人员的安全意识。
- 5、加强个人防护，严禁赤膊和穿拖鞋上岗，防止阳光曝晒，做好防晒措施；露天施工要避免阳光直射头部，避免皮肤直接吸收辐射热，进入施工现场要正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全绳，同时要加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。
- 6、为防止高处坠落，身体患有高血压、心脏病、恐高症者、无登高证者严禁进行高处作业。
- 7、遇大雨、雷电和六级以上大风时，禁止高处与户外作业。加强暴雨期间（尤其是夜间）对起重设备、深基坑和职工宿舍等临时设施的巡查，落实重大安全事故应急救援措施。
- 8、加强施工现场临时用电安全管理，做到“三级配电，二级漏电保护”，线路必须规范进行铺设，配电箱要搭防晒防雨棚。
- 9、加强对易燃易爆物品如油漆涂料氧气瓶等的管理，严格执行消防制度及监护制

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

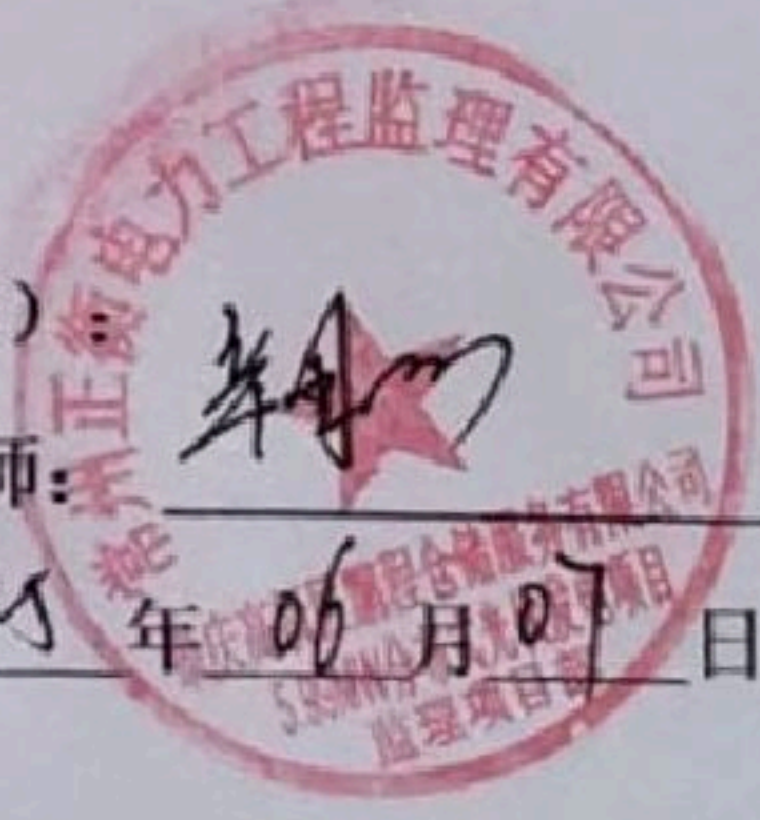
度；现场必须配备足够的灭火器材，对灭火器材的使用进行培训，制定应急措施，消除火灾隐患。

10、施工现场电焊作业时，应穿戴好绝缘手套和绝缘鞋，使用护目面罩；雷雨天气时，应停止露天焊接作业，严禁吸烟和使用明火；在使用过程中应严格遵守安全操作规程，做好防晒晒工作。

11、加强对危大工程、特种设备等领域的安全监督，从严落实高温气候的日常监控、监督措施。

12、对在高温季节中中暑的人员，首先应将中暑患者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子、让其平卧，头部放低，保持患者呼吸畅通；用凉水或 50%酒精擦其全身，直到皮肤发红，血管扩张以促进散热、降温；对于能饮水的患者应鼓励其多喝凉开水或其他饮料，不能饮水者，应将其及时送往医院进行治疗。

望贵单位重视！

项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师：
日期：2025 年 06 月 07 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备
