

监理通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CY-GF-HF-003

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-003 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

整改措施: 对光伏板夹块进行自我检查, 发现未夹紧、偏差的先标记; 然后对标记的光伏板夹块重新固定, 上下一一调整, 夹块和光伏板保持平整

附件:

图 1、2



监理项目部复查意见:

经复查已合格.



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 监理项目部一份, 施工项目部存 2 份



图 1

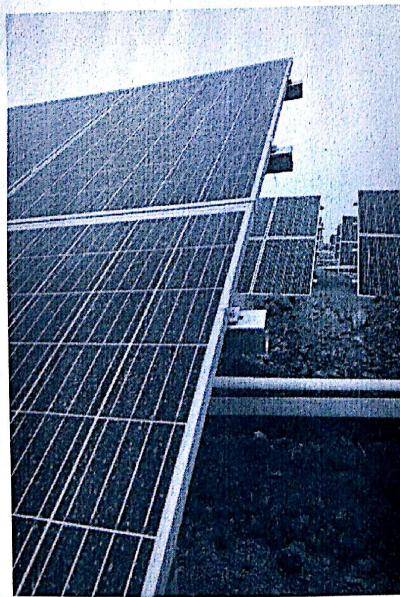


图 2
