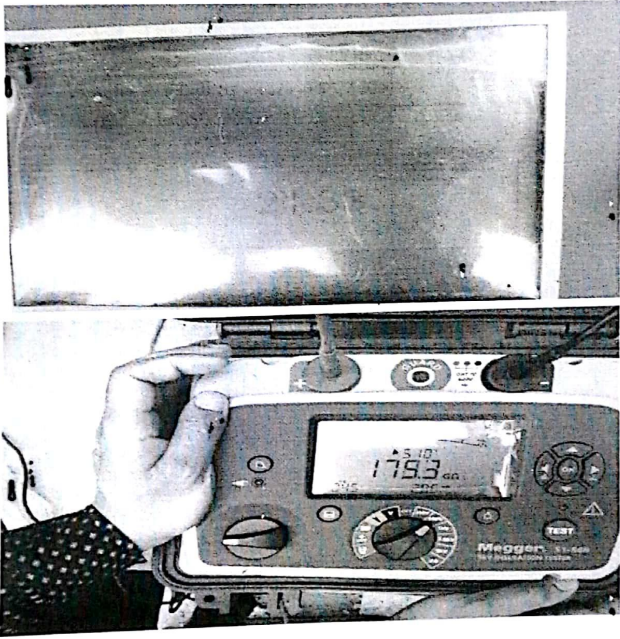


旁站监理记录表

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TWZH-PZ-003

日期及天气：2018 年 3 月 25 日 多云转雨	施工单位：晶科电力科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：高压电缆实验	
旁站监理开始时间：10: 30	旁站监理结束时间：16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况：上午 10 点 30 左右实验器具到场，工作人员制作高压电缆头，按照规范要求开始做实验前的准备：让现场人员站到安全区域范围，不得靠近实验区域，然后开始测试低压部分的电阻值，然后开始耐压测试。 附如下图： 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：邵心雷	2018 年 3 月 25 日

注：本表一式一份，监理项目部留存。
