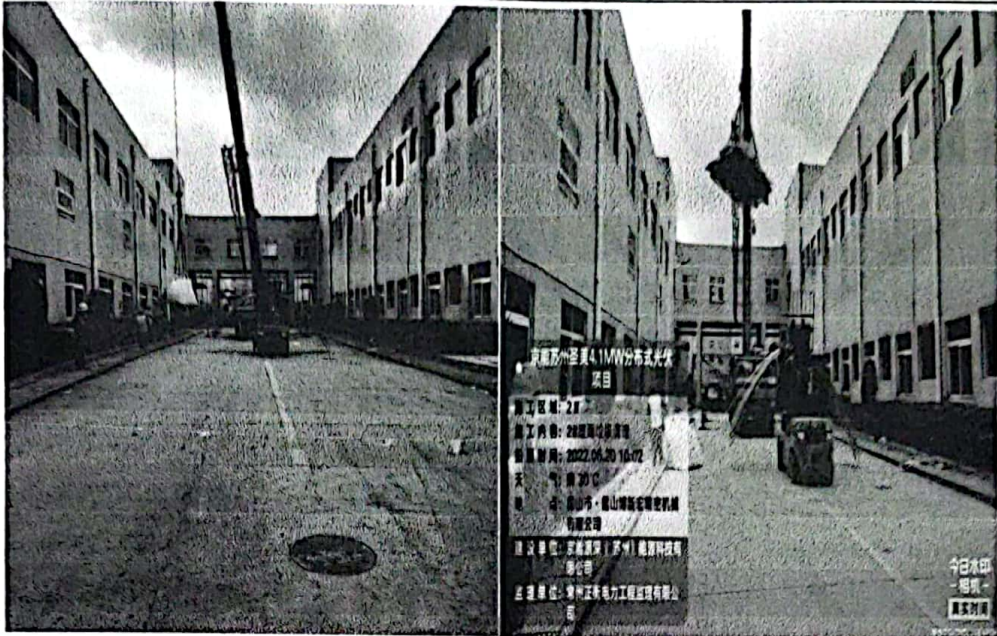


工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-JNSM-AP008

现场工作内容	1#2#8#14#15 屋面垃圾清理吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	3 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机；作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。屋面不准堆积存放。	
现场主要问题		无 整改结果：无	无 复验意见：无
	旁站时间		开始 结束
		对应作业	

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建
