

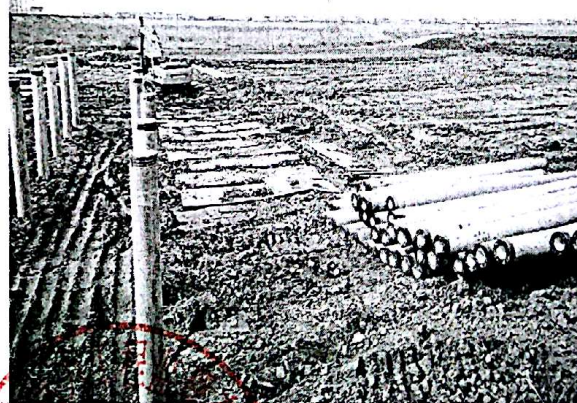
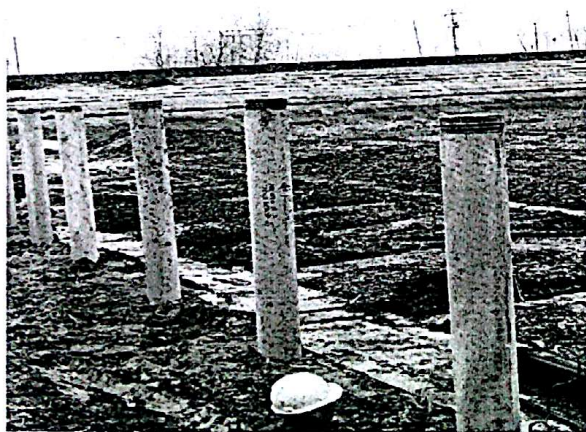
监理工作联系单

工程名称：通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 编号：ZHJL-09

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

事由：关于开关站桩基质量的问题

内容：你公司承包施工的本项目工程，开关站已开始打桩施工，监理巡视检查发现：个别桩基垂直度、标高偏差较大，影响整体观感。现业主、监理要求现场施工项目部加大质量管理力度，对桩基施工人员做好技术交底，必须按图纸设计要求施工。锤重的选择要根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来决定，应使锤跳动正常。控制好管桩基准高度、垂直度，不得出现桩顶标高呈波浪状现象，保证桩基排列整齐、美观。

项目监理单位（章）：项目
监理单位

总/专业监理工程师：葛永琦

日期：2017年2月26日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。
