

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期


编号：GFDZJBM07-16

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于西区电缆沟开挖事宜

内容

今日我方监理在对现场巡视中发现，2 号、4 号箱变直埋电缆沟现已开挖，经过现场对电缆沟深度的实际测量发现，电缆沟深度不足，过路直埋电缆沟开挖只要 80cm，图纸要求 100cm。且电缆埋管已下敷，现要求贵方 立即加深过路电缆沟的埋深，埋管前应先进行排水，且需铺沙盖砖。挖出的垃圾清理干净禁止直接掩埋回填。

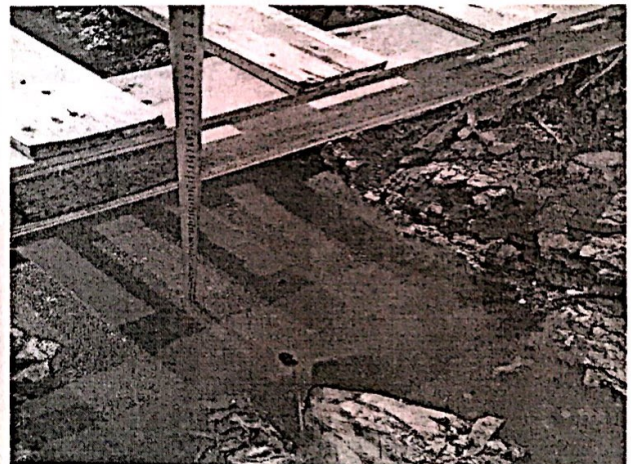

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪永波

日期：2018 年 06 月 13 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。
